



การบริหารงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์กรฤช ลัมสมบัติ
ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข
14 พฤษภาคม 2567





กรอบการนำเสนอ

1

การบริหารงบประมาณปี 2565

2

การบริหารงบลงทุนปี 2566 ที่กันเงินหลัอมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2567

3

การบริหารงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567 และTimeline





การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565

สป.สร. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
สำหรับเป็นค่าชดเชยงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ถูกพับไป จำนวน 13 รายการ วงเงิน 138,929,400 บาท



สำนักงบประมาณ ได้นำเรื่องดังกล่าวกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว และเห็นชอบให้ สป.สร.
พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

- พิจารณาใช้เงินบำรุงโรงพยาบาล
- พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากโครงการ/รายการที่
ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย และ/หรือรายการที่หมดความจำเป็น และ/หรือรายการที่คาดว่าจะไม่
สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร แล้วแต่กรณีตามระเบียบว่า
ด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0712/5549 ลงวันที่ 26 เม.ย. 67)

ข้อเสนอ ให้พิจารณการบริหารจัดการภายในเขต One Province One Hospital



1. ภาพรวมรายการงบประมาณปี 2566 ที่กันเงินหลัอมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2567

ข้อมูล GFMS ณ 1 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลผลการดำเนินการ

ยอดเงินกันหลัอมปี (ณ 2 ต.ค. 66)	5,598,908,892.69 บาท	
เบิกจ่าย (ณ 1 พ.ค. 67)	2,995,515,927.55	(ร้อยละ 53.50)
คงหลัอ (ณ 1 พ.ค. 67)	2,599,414,056.82	(ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ)
มีหนี้ผูกพัน (PO) (ณ 1 พ.ค. 67)	2,104,884,655.98	
สำรองเงิน (ณ 1 พ.ค. 67)	498,508,309.16	(กส. 26 รายการ)



1. รายการงบประมาณปี 2566 ที่กันเงินหล่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2567

จำแนกตามประเภท

ข้อมูล GFMS ณ 1 พฤษภาคม 2567

ประเภทงบประมาณ	จำนวนทั้งสิ้น (รายการ)	วงเงินที่กัน หล่อมปี 2566 ทั้งสิ้น (บาท)	วงเงินที่เบิกจ่าย ณ 1 พ.ค. 67 (บาท)	วงเงินสำรองเงิน ณ 1 พ.ค. 67 (บาท)	วงเงินคงเหลือ ณ 1 พ.ค. 67 (ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ)	
					จำนวน (รายการ)	วงเงินคงเหลือ (บาท)
รวม	576	5,598,908,892.69	2,995,515,927.55	498,508,309.16	146	2,599,414,056.82
ครุภัณฑ์	176	338,251,134.08	332,327,554.08	2,563,580.00	1	3,360,000.00
ก่อสร้างปีเดียว	275	821,291,428.07	591,065,297.50	10,272,889.80	64	228,962,021.31
ก่อสร้างผูกพัน	125	4,439,366,330.54	2,072,123,075.97	485,671,839.36	81	2,367,092,035.51



1. รายการรงบลงทุนปี 2566 ที่กันเงินหล่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2567

จำแนกตามสถานะความเสี่ยง

ข้อมูล GFMS ณ 1 พฤษภาคม 2567

ประเภท งบลงทุน	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ		ความเสี่ยงต่ำ		ความเสี่ยงปานกลาง		ความเสี่ยงสูง		รวมทั้งสิ้น	
	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (บาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงินคงเหลือ (บาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงินคงเหลือ (บาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงินคงเหลือ (บาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงินคงเหลือ (บาท)
รวม	430	1,511,898,617.57	2	1,885,243.07	74	825,844,303.94	70	1,771,684,509.81	576	5,598,908,892.69
ครุภัณฑ์	175	318,887,554.08			1	3,360,000.00			176	338,251,134.08
ก่อสร้างปีเดียว	211	464,843,008.25			41	135,111,529.96	23	93,850,491.35	275	821,291,428.07
ก่อสร้างผูกพัน	44	728,168,055.24	2	1,885,243.07	33	690,732,773.98	46	1,674,474,018.46	125	4,439,366,330.54

หมายเหตุ :

เกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยง ณ 1 พ.ค. 67
(ปรับตามระยะเวลาที่เหลือ)

รายการปีเดียว

เสี่ยงต่ำ = รายการที่เบิกจ่ายได้ ภายใน มี.ค. 67

เสี่ยงปานกลาง = รายการที่เบิกจ่ายได้ ภายใน มี.ย. 67

เสี่ยงสูง = รายการที่เบิกจ่าย ตั้งแต่ ก.ค. 67 เป็นต้นไป

รายการผูกพัน

เสี่ยงต่ำ = รายการที่มีวงเงินคงเหลือ 1 งวด (หลักเกณฑ์เดิม 1-2 งวด)

เสี่ยงปานกลาง = รายการที่มีวงเงินคงเหลือ 2-3 งวด

(หลักเกณฑ์เดิม 3-4 งวด)

เสี่ยงสูง = รายการที่มีวงเงินคงเหลือตั้งแต่ 4 งวดขึ้นไป/ผู้รับจ้างทำงาน/
ยังไม่ลงนามสัญญา/แก้ไขสัญญา (หลักเกณฑ์เดิม 5 งวดขึ้นไป)

รายการกิจการ รวม 193,270,031.42 บาท

- อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 ชั้น) โรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน 35,513,431.42 บาท
- อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 โรงพยาบาลสมุทรปราการ วงเงิน 3,264,500 บาท
- อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก(ICU) sw.สิรินธร วงเงิน 58,108,400 บาท
- อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงิน 4,151,200 บาท
- อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) sw.สุราษฎร์ธานี วงเงิน 122,232,500 บาท



1. รายการงบประมาณปี 2566 ที่กันเงินหลัอมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2567

รายเวต

ข้อมูล GFMS ณ 1 พฤษภาคม 2567

เวต	ภาพรวม				ความเสี่ยงต่ำ		ความเสี่ยงปานกลาง		ความเสี่ยงสูง	
	จำนวน (รายการ) 1 เม.ย. 67	วงเงินคงเหลือ (ลบ.) 1 เม.ย. 67	จำนวน (รายการ) 1 พ.ค. 67	วงเงินคงเหลือ(ลบ.) 1 พ.ค. 67	จำนวน (รายการ)	วงเงินคงเหลือ (ลบ.)	จำนวน (รายการ)	วงเงินคงเหลือ (ลบ.)	จำนวน (รายการ)	วงเงินคงเหลือ (ลบ.)
รวม	165	3,017.12	146	2,599.41	2	1.89				
1	12	349.03	9	194.78			3	7.96	6	186.82
2	14	296.81	11	238.78			5	21.31	6	217.48
3	5	145.12	5	139.32			3	76.66	2	62.66
4	12	226.73	11	177.32			3	32.17	8	145.15
5	8	133.38	6	130.27			5	98.14	1	32.14
6	14	176.21	13	160.79			5	36.80	8	123.99
7	12	232.55	8	210.17			6	72.33	2	137.84
8	16	322.31	16	317.97			12	107.84	4	210.12
9	18	405.41	17	362.64	1	1.28	8	208.22	8	153.14
10	8	94.49	8	88.15	1	0.60	1	2.85	6	84.69
11	20	330.86	19	306.55			6	20.32	13	286.23
12	21	245.11	18	228.87			16	131.76	2	97.11
สพวช.	4	55.75	4	40.45			1	9.49	3	30.96
ส่วนกลาง	1	3.36	1	3.36			1	3.36		



1. รายการรงบลงทุนปี 2566 ที่กันเงินหล่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2567

ก่อสร้างปีเดียว **เสี่ยงสูง**

จำนวน **23** รายการ วงเงินคงเหลือ **93,850,491.35** บาท

ข้อมูล GFMS ณ 1 พฤษภาคม 2567

IVต	รายการ	สถานที่	เงินกันหล่อมปีสุทธิ ณ 2 ตุลาคม 2566	เบิกจ่าย	วงเงินกันหล่อมปี คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน
2	บ้านพักข้าราชการชำนานงาน/ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ชำนานการ	รพ.สต.วังพิณพาทย์ จ. สุโขทัย	1,138,200.00	266,660.00	871,540.00	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1 จาก 5 งวดงาน 2. ประเด็นปัญหา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงิน 1,237,000 บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้จัดสรร (1,138,200 บาท) เป็นเงิน 98,800 บาท จึงขออนุมัติใช้เงินบำรุงสมทบ โดยขอ ทำความเข้าใจความตกลงกับกระทรวงการคลัง จึงลงนามล่าช้า
2	บ้านพักข้าราชการชำนานงาน/ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ชำนานการ	โรงพยาบาลคีรีมาศ จ. สุโขทัย	2,260,000.00	316,400.00	1,943,600.00	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 2 จาก 4 งวดงาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว นัดตรวจรับวันที่ 22 ก.พ. 67 2. ประเด็นปัญหา ช่วงเจาะเสาเข็ม ฝนตกหนัก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแผนที่วางไว้ จึงทำให้งานล่าช้า
2	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 576 ตารางเมตร	โรงพยาบาลชาติ ตระการ จ. พิษณุโลก	5,968,785.00	2,011,950.00	3,956,835.00	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 3 จาก 6 งวดงาน คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานประมาณเดือน มี.ค. 67 2. ประเด็นปัญหา ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง ทำให้ขาดแคลนแรงงาน
4	ปรับปรุงระบบห้องผ่าตัดมาตรฐานและระบบ หมุนเวียนอากาศแบบลามินาร์	โรงพยาบาลบางใหญ่ จ. นนทบุรี	6,045,000.00	604,500.00	5,440,500.00	1 ขณะนี้อยู่งวด 1/4 เริ่มสัญญา 13 ธ.ค. 66 ถึง 9 ก.ค. 67 (ก่อสร้างตามแผนสัญญา) คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 31 ส.ค. 67 2 ประเด็นปัญหา 2.1การเปลี่ยนแปลงห้องในการปรับปรุง จึงต้องทำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงห้องไปใหม่ 2.2เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับจ้างลงนาม จึงทำให้มีการแก้ไขเอกสารหลายครั้ง
4	ปรับปรุงระบบอากาศห้องผ่าตัดชนิดความดันบวก พร้อมควบคุมความชื้น	โรงพยาบาลบางใหญ่ จ. นนทบุรี	2,325,000.00	232,500.00	2,092,500.00	1 ขณะนี้อยู่งวด 1/4 คาดส่งมอบ 29 ก.พ. 67 (ก่อสร้างตามแผนสัญญา) เริ่มสัญญา 13 ธ.ค. 66 ถึง 9 ก.ค. 67 คาดว่าจะเบิกจ่าย งบหล่อมปี 66 แล้วเสร็จ 31 ส.ค. 67 2 ประเด็นปัญหา การเปลี่ยนแปลงห้องในการปรับปรุง จึงต้องทำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงห้องไปใหม่ เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงผู้รับจ้างลงนาม จึงทำให้มีการแก้ไขเอกสารหลายครั้ง
4	ปรับปรุงโครงสร้างหอผู้ป่วยวิกฤต ICUsระบบ อากาศธรรมดา	โรงพยาบาลบางใหญ่ จ. นนทบุรี	14,428,900.00	1,413,000.00	13,015,900.00	1 ขณะนี้อยู่งวด 1/5 คาดส่งมอบ 29 ก.พ. 67(ก่อสร้างตามแผนสัญญา) เริ่มสัญญา 13 ธ.ค. 66 ถึง 9 ก.ค. 67 คาดว่าจะเบิกจ่าย งบหล่อมปี 66 แล้วเสร็จ 30 ส.ค. 67 2 ประเด็นปัญหา การเปลี่ยนแปลงห้องในการปรับปรุง จึงต้องทำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงห้องไปใหม่ เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงผู้รับจ้างลงนาม จึงทำให้มีการแก้ไขเอกสารหลายครั้ง
4	บ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับสูง	สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ลพบุรี	2,998,000.00	524,655.50	2,473,344.50	บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานตั้งแต่ 13 พ.ย. 66 (93 วัน) - แจ้งขอบอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างแล้ว (ลว. 31 ม.ค. 67) - แจ้งผู้รับจ้างมาชี้แจงเหตุผลเรื่องไม่เข้าทำงานภายใน 15 วันทำการ(ลว.9ก.พ. 67) - ขณะนี้อยู่งวด 2/6 (ก่อสร้างล่าช้า 4 งวด สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อ 30 ส.ค. 66) 2 ประเด็นปัญหา 2.1 ผู้รับจ้างไม่เข้างาน 3 ทำหนังสือบอกเลิกสัญญาแล้ว ต้นเดือน กพ 67



1. รายการงบประมาณปี 2566 ที่กันเงินหลัอมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2567

ก่อสร้างปีเดียว **เสี่ยงสูง**

ข้อมูล GFMS ณ 1 พฤษภาคม 2567

IVต	รายการ	สถานที่	เงินกันหลัอมปีสุทธิ ณ 2 ตุลาคม 2566	เบิกจ่าย	วงเงินกันหลัอมปี คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน
6	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)	สว.สต.เจริญ ราษฎร์ จ. สมุทรปราการ	1,126,600.00	0	1,126,600.00	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 3 จาก 5 งวดงาน ขออนุมัติต่อสัญญาเช่ากับเคหะ รอเคหะอนุมัติต่อสัญญาให้ ยังไม่ อนุมัติ 2. ประเด็นปัญหา ที่ดินเป็นขอเคหะ เคหะระงับการก่อสร้างเนื่องจากสัญญาเช่าหมดอายุ ไม่ได้ขออนุมัติก่อสร้างต่อ การเคหะ
6	บ้านพักข้าราชการ อำนวยความสะดวกระดับสูง	สว.บางจาก จ. สมุทรปราการ	2,918,800.00	0	2,918,800.00	1.อยู่ระหว่างทดสอบดิน ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง 2. ประเด็นปัญหา อยู่ระหว่างทำหนังสือบอกเลิกสัญญา
6	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ชำนาญการ	สว.สต.หนองบอน จ. ระยอง	1,098,817.00	153,834.38	944,982.62	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1 จาก 5 งวดงาน 2. ประเด็นปัญหา 2.1 ผูกเหล็กไม่เรียบร้อย ให้แก้ไขให้เรียบร้อยก่อน ถึงจะส่งมอบงานได้ 2.2 ขาดแคลนแรงงาน อาจจะบอกเลิกสัญญาเนื่องจากงานไม่คืบหน้า แต่ตอนนี้ผู้รับจ้างดำเนินงานต่อ
6	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ชำนาญการ	สว.สต.บ้านเขา ตาอิน จ.ระยอง	757,428.87	0	757,428.87	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงานที่ 4 จาก 5 งวดงาน 2. ประเด็นปัญหา ขาดแคลนแรงงาน
8	ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว	สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด บึงกาฬ	14,740,500.00	1,474,000.00	13,266,500.00	1. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1 จาก 8 2. ได้รับสนับสนุนจากเงินเหลือจ่าย ปี66 เนื่องจากชื่อรายการที่รับจัดสรร ไม่ตรงตามแบบแปลน จึงขอแก้ไขชื่อ รายการไปที่ สป.จึงทำให้เกิดความล่าช้า 2. สสจ.บึงกาฬ ตกกลับผู้รับจ้างให้ดำเนินการเร่งการก่อสร้างให้เร็วขึ้น ปรับงวดงานลดระยะเวลาก่อสร้าง 3. กบรส.กำกับติดตามให้ดำเนินการก่อสร้าง เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน และสรุปข้อมูลเสนอ ผู้บริหาร
8	บ้านพักข้าราชการ อำนวยความสะดวกระดับสูง	โรงพยาบาลกุม ภวาปี	2,214,000.00	270,000.00	1,944,000.00	1. อยู่ระหว่างการทำงานการงวดงานที่ 3 จาก 6 2. สาเหตุความล่าช้า ผู้รับจ้างจ้างสภาพคล่องทางการเงิน บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างรายเดิม 3.ได้ผู้รับจ้างรายใหม่แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในงานส่วนที่เหลือ
9	อาคารพัสด 2 ชั้น	โรงพยาบาลคง จ. นครราชสีมา	8,555,700.00	2,752,227.00	5,803,473.00	1. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1- 2 จาก 5 งวด 2. ประเด็นปัญหา อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา เปลี่ยนแปลงฐานรากเป็นชนิดไม่ตอกเสาเข็ม (ฐานรากแผ่)
9	อาคารสถานีอนามัย 2 ชั้น	สว.สต.ฝ่าย พญานาค จ.ชัยภูมิ	3,948,000.00	2,560,515.00	1,387,485.00	เบิกจ่ายงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 4



1. รายการงบประมาณปี 2566 ที่กันเงินเหลือมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2567

ก่อสร้างปีเดียว **เสี่ยงสูง**

ข้อมูล GFMS ณ 1 พฤษภาคม 2567

IVต	รายการ	สถานที่	เงินกันเหลือมปีสุทธิ ณ 2 ตุลาคม 2566	เบิกจ่าย	วงเงินกันเหลือมปี คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน
10	อาคารห้องพิเศษ ตักผู้ป่วยใน 1 ชั้น	โรงพยาบาลกุด ข้าวปุ้น	3,136,000.00	929,274.60	2,206,725.40	1. อยู่ระหว่าง กวจ.พิจารณาผลการอุทธรณ์ 2. คาดผลการอุทธรณ์ออกในเดือน ก.พ. 67
10	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1 ชั้น	โรงพยาบาลคำ เขื่อนแก้ว	8,493,321.34	4,253,227.20	4,240,094.14	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 3 จาก 7 งวดงาน (งวด 3 คาดส่งมอบ มีค 67) 2. ลำช้าเนื่องจากขาดแคลนแรงงาน (คนงาน 5-6 คน) 3. สว. มีหนังสือเร่งรัดการดำเนินงาน และพรจ.ปรับแผนการดำเนินงาน
11	อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด 2 ชั้น	โรงพยาบาลเกาะ ลันตา	35,036,000.00	13,359,983.0 0	21,676,017.0 0	อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 3 เทศบาลหลังคาและก่อผนังอิฐฉาบปูน ชั้นล่าง ผู้รับจ้างนัดส่งงานงวดที่ 3 วันที่ 4 มีค67 คาดว่าจะเบิกจ่ายงบเหลือมปี 66 แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 7 ส.ค. 67 ลำช้า 1 งวดเนื่องจากงวดที่ 1 มีการปรับเรื่อง ความยาวเสาเข็ม สว.ได้แจ้งผู้รับจ้างให้ปรับแผนการก่อสร้างให้เป็นตามสัญญา กบรส ติดตามทุกอาทิตย์
11	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ชำนาญการ	โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเกาะยาวใหญ่ จ.พังงา	1,470,400.00	205,856.00	1,264,544.00	สัญญาที่ 1 พรจ.ไม่เข้าทำงานตามสัญญา สัญญาที่ 2 สิ้นสุดสัญญา 12 มีค67 ลำช้า จังหวัดให้ผู้รับจ้างปรับแผนก่อสร้างใหม่ จำนวนงวดงาน 5 งวด ขณะนี้อยู่ ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1 งวดสุดท้ายตามแผน กำหนดส่ง มีย 67 มีค่าปรับล่าช้า คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายใน ก.ค.67
11	ทางเดินเชื่อมอาคาร ความยาว 20.75 เมตร	โรงพยาบาลพังงา	1,019,621.82	0	1,019,621.82	ล่าช้ามีค่าปรับเกิน 10 % จึงบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 126/2566 ลงวันที่ 31 ม.ค. 66 บริษัท ไฟฟ้าการ ก่อสร้าง จำกัด โดยส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างวันที่ 8 ธ.ค. 66 และอยู่ในขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด แบบรูปรายการและราคากลางจัดจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ 2) กำหนดเสนอราคาวันที่ 22 กพ 67 คาดว่าลงนาม 21 มีค 67
11	อาคาร คสล.1 ชั้น คลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดิน หายใจ (Acute Respiratory Infection : ARI Clinic)	โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต	2,610,000.00	0	2,610,000.00	ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน มีค่าปรับเกิน 10 % แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 และจะ ดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ ในปี 2567 อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ร่าง คาดว่าจะลงนามสัญญา 18 มี.ค. 67
11	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการ พิเศษ	โรงพยาบาลท่า แซะ จ.ชุมพร	1,600,000.00	0	1,600,000.00	ผู้รับจ้างเข้าทำงานไม่สม่ำเสมอบอกเลิกสัญญา19 กพ 67 ดำเนินการจัดจ้างใหม่ มีค 67 คาดว่าเบิกจ่าย กย67
11	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการ พิเศษ	สำนักงาน สาธารณสุขอำเภ ปะทิว จ.ชุมพร	1,500,000.00	210,000.00	1,290,000.00	อยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดที่ 2 ผู้รับจ้างรับงานหลายที่ งานไม่ก้าวหน้า จังหวัดบอกเลิกสัญญา15 กพ 67 ดำเนินการจัดจ้างใหม่ มีค 67 คาดว่าเบิกจ่าย กย67



1. รายการรงบลงทุนปี 2566 ที่กันเงินหล่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2567

ก่อสร้างผูกพัน **เสี่ยงสูง**

ข้อมูล GFMS ณ 1 พฤษภาคม 2567

รายการ	จำนวน	วงเงินคงเหลือ
	46	1,674,474,018.46
สิ้นสุดปี 66	6	375,159,887.00
สิ้นสุดปี 67	3	57,616,331.42
ตั้งแต่ปี 68	37	1,241,697,800.04

IVต	รายการที่สิ้นสุดปี 66	จำนวน	วงเงินคงเหลือ
	รวม	6	375,159,887.00
1	อาคารผู้ป่วยนอก(โรงพยาบาลชุมชน)พร้อมอาคารห้องเครื่องระบบไปป์ไลน์ โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	1	34,221,600.00
1	อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1	5,655,150.00
2	อาคารวินิจฉัยและรักษา 8 ชั้น โรงพยาบาลอุตรดิตถ์	1	190,031,358.00
4	อาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย 9 ชั้น โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี	1	79,471,100.00
4	อาคารรวมบริการทางการแพทย์ 5 ชั้น โรงพยาบาลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	1	5,942,079.00
6	อาคารอุบัติเหตุ 4 ชั้น โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี	1	59,838,600.00

IVต	รายการที่สิ้นสุดปี 67	จำนวน	วงเงินคงเหลือ
	รวม	3	57,616,331.42
1	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น โรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่	1	35,513,431.42
2	ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลพุทธชินราช สาขาบึงแก่งใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก	1	5,000,000.00
สบพช.	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 72 ยูนิต 6 ชั้น โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์	1	17,102,900.00



1. รายการรงบลงทุนปี 2566 ที่กันเงินหล่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2567

ก่อสร้างผูกพัน **เสี่ยงสูง**

ข้อมูล GFMS ณ 1 พฤษภาคม 2567

IVต	รายการที่สิ้นสุดปี 67	จำนวน	วงเงินคงเหลือ
	รวม	37	1,241,697,800.04
1	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) 5 ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน	1	18,543,600.00
1	หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง) 7 ชั้น โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง	1	20,063,370.62
1	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ และบำบัดรักษา 5 ชั้น โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1	72,819,600.00
2	อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น โรงพยาบาลสวรรค์โลก จังหวัดสุโขทัย	1	15,672,949.50
3	อาคารผู้ป่วยนอก กันตกรรม และพยาธิวิทยาคลินิก 4 ชั้น โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร	1	37,725,000.00
3	อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพิเศษและส่งเสริมสุขภาพ 5 ชั้น โรงพยาบาลชยันตเกษม จังหวัดชัยนาท	1	24,931,105.24
4	อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด LAB และอำนวยการ 5 ชั้น โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1	27,119,318.00
4	อาคารโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ 4 ชั้น โรงพยาบาลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี	1	9,591,700.00
5	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและผู้ป่วยใน 5 ชั้น โรงพยาบาลสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1	32,135,600.00
6	อาคารผ่าตัด อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน 5 ชั้น โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง	1	25,735,202.25
6	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น 3 ชั้น โรงพยาบาลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	1	6,413,058.63
6	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	1	26,256,433.43
7	อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก(ICU) 4 โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	1	58,108,400.00
7	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุและหัวใจ 12 ชั้น โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	79,733,422.23
8	อาคารพักคนไข้ 10 ชั้น โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1	8,587,140.00
8	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน 7 ชั้น โรงพยาบาลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	1	186,325,800.00
9	หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง) 7 ชั้น โรงพยาบาลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	1	30,938,800.00
9	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น ร โรงพยาบาลบ้านเว้า จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	1	12,621,138.00



1. รายการรงบลงทุนปี 2566 ที่กันเงินหล่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2567

ก่อสร้างผูกพัน **เสี่ยงสูง**

ข้อมูล GFMS ณ 1 พฤษภาคม 2567

IVต	รายการที่สิ้นสุดปี 67	จำนวน	วงเงินคงเหลือ
9	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 ชั้น โรงพยาบาลจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	1	25,065,600.00
9	อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน 300 เตียง 8 ชั้น โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	1	49,910,602.00
9	อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน 300 เตียง 8 ชั้น โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	22,829,739.20
9	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีชะเลียง จังหวัดนครราชสีมา	1	4,587,400.00
10	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	1	21,101,700.00
10	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) 5 ชั้น โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	1	12,746,064.00
10	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร	1	29,614,119.96
10	อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี	1	14,783,600.00
11	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) 5 ชั้น โรงพยาบาลกลาง จังหวัดภูเก็ต	1	14,640,519.41
11	อาคารผู้ป่วย 120 เตียง และหน่วยแพทย์แผนไทย 6 ชั้น โรงพยาบาลไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1	29,706,400.00
11	อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) 9 ชั้น โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1	122,232,500.00
11	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น โรงพยาบาลเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1	22,007,200.00
11	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	4,151,200.00
11	อาคารโรงครัว กายภาพบำบัด โรงอาหาร ชักฟอก นึ่ง จ่ายกลางและพัสดุ 3 ชั้น โรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	1	11,919,000.00
11	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม 6 ชั้น โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา	1	52,116,000.00
12	อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส	1	66,255,200.00
12	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา	1	30,851,140.39
สบพช.	อาคารพักนักศึกษาแพทย์ 96 ยูนิต 7 ชั้น ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	1	6,871,100.00
สบพช.	อาคารพักนักศึกษาแพทย์ 96 ยูนิต 8 ชั้น ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	1	6,987,077.18



2. การบริหารงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูลจากกองบริหารการคลัง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

วงเงินงบลงทุนสุทธิ 9,052.16 ลบ.

- การใช้จ่ายงบลงทุน (เบิกจ่าย+PO) 778.67 ลบ. (8.60 %)
 - ☐ เบิกจ่าย 561.34 ลบ. (6.20 %)
 - ☐ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) 217.33 ลบ. (2.40 %)
- คงเหลือ 8,273.48 ลบ. (91.40 %)

กบรส.แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน สป.สร.

ตามหนังสือ สป.สร. ด่วนที่สุด ที่ สร 0207.03/13145 เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 67

ปัจจุบันอยู่ระหว่างกองบริหารการคลังโอนเงินจัดสรร





2. การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567

(ภาพรวม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 สป.สร.)

จำนวน 4,104 หน่วย
วงเงินรวมทั้งสิ้น 9,052.16 ล้านบาท

รายการผูกพันใหม่

ได้ผู้รับจ้าง รอลงนาม ภายในเดือน ส.ค. 67
จำนวน 95 หน่วย วงเงิน 1,237.58 ล้านบาท

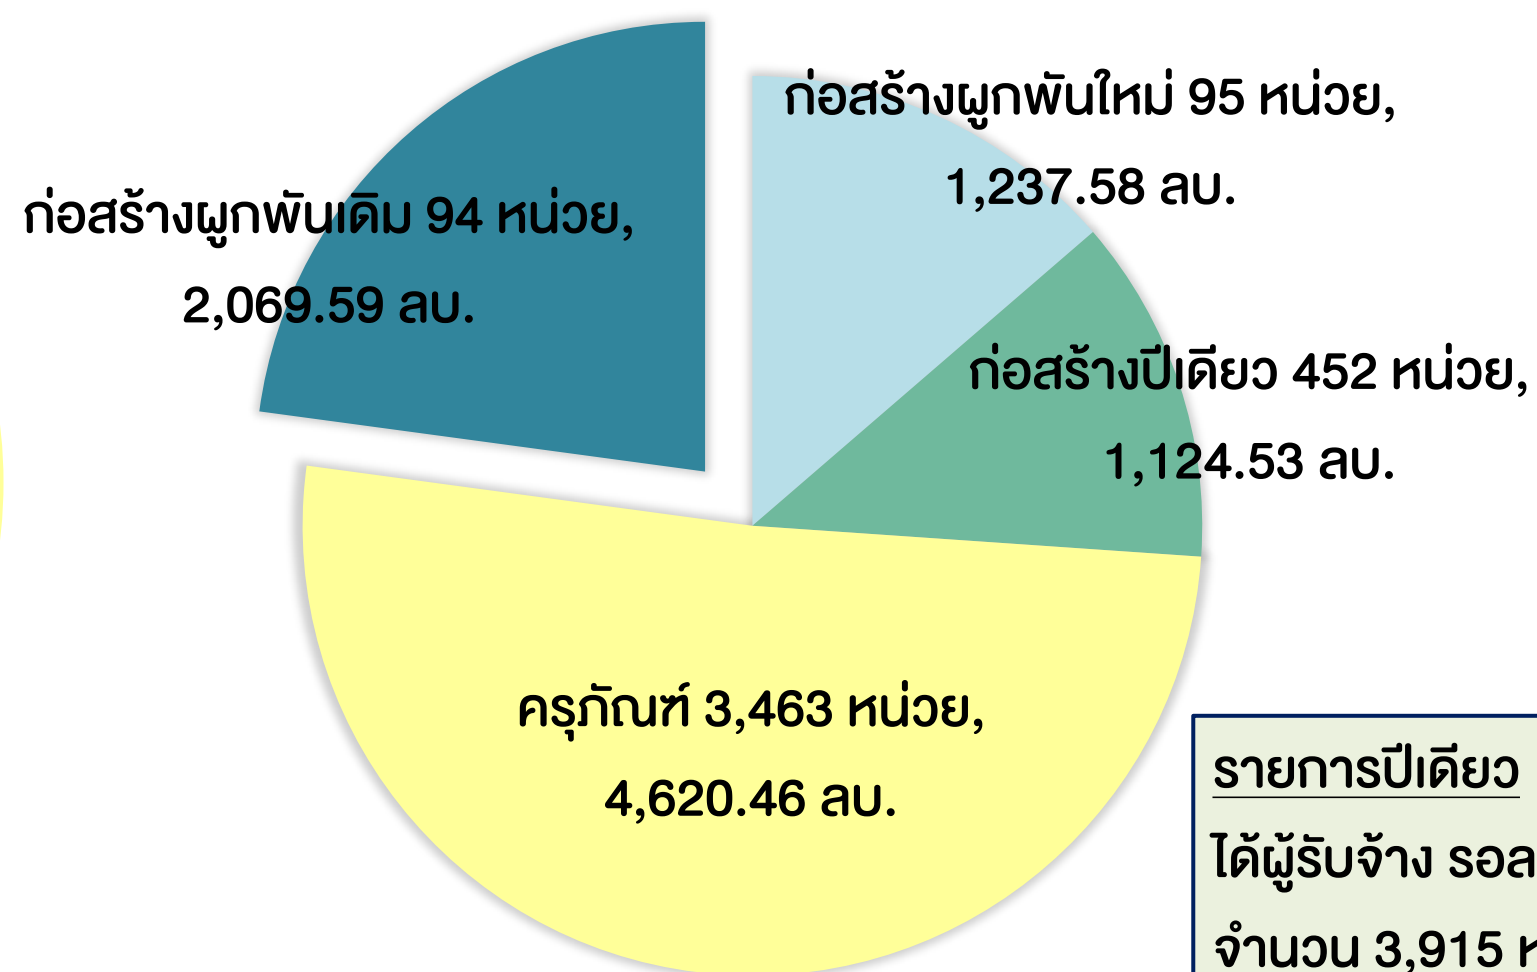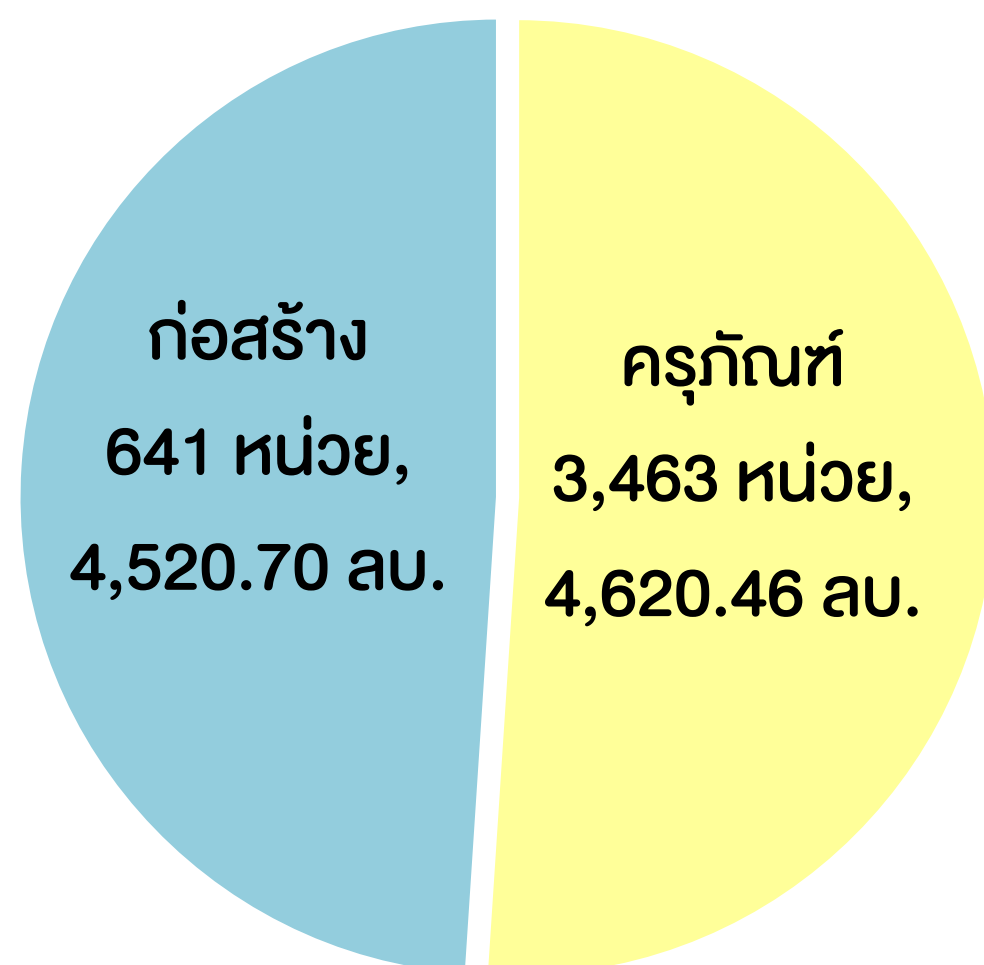

รายการปีเดียว

ได้ผู้รับจ้าง รอลงนาม ภายในเดือน มิ.ย. 67
จำนวน 3,915 หน่วย วงเงิน 5,744.99 ล้านบาท



2. การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567

มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567
ให้ ใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน จำแนกรายไตรมาส ดังนี้

การใช้จ่ายงบลงทุน	
ไตรมาสที่ 1	11
ไตรมาสที่ 2	24
ไตรมาสที่ 3	80
ไตรมาสที่ 4	100

1. ให้นำหน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้โดยเร็ว ควรดำเนินการ ดังนี้
 - เร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาคภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
 - กรณีรายการผูกพันใหม่ ให้นำหน่วยรับงบประมาณ จัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการ ราคากลาง และรายละเอียดประกอบที่เกี่ยวข้อง ให้ สปป. พิจารณา ความเหมาะสมของราคาควบคุมไปกับการดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หากไม่เกินวงเงินที่ สปป. ให้ความเห็นชอบ ให้แจ้ง สปป. ทราบ และดำเนินการทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันต่อไปได้
2. กำหนดส่งมอบงานให้เร็วขึ้น
 - รายการปีเดียว พิจารณาส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้ทันเบิกจ่าย ภายใน ก.ย. 67
 - รายการผูกพันใหม่ ควรก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน พ.ค. 67



2. การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567

สรุปการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พรบ. 2567 (ตามประเภทงบประมาณ)

ข้อมูล ณ 9 พฤษภาคม 2567

ประเภทงบประมาณ	รวมจัดสรร (หน่วย)	ผลการดำเนินงาน (หน่วย)							
		ก่อนประกาศ		ประกาศ		รอลงนาม		คืบจน	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	4,010	1,920	48.01	497	12.43	1,582	39.56	11	0.27
ครุภัณฑ์	3,463	1,496	43.24	455	13.15	1,509	43.61	3	0.09
ก่อสร้างปีเดียว	452	330	74.32	41	9.23	73	16.44	8	1.77
ก่อสร้างผูกพันใหม่	95	94	98.95	1	1.05				



2. การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567

สรุปการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ร.บ. 2567 (จำแนกรายเขต)

ข้อมูล ณ 9 พฤษภาคม 2567

	พ.ร.บ. 2567		ก่อนประกาศ		ประกาศ		รอลงนาม		คืบหน้า	
เขต	จำนวน (หน่วย)	วงเงิน (บาท)	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	4,010	6,982,573,800	1,920	48.01	497	12.43	1,582	39.56	11	0.27
1	183	499,398,300	82	44.81	29	15.85	72	39.34		
2	292	538,411,000	102	35.17	16	5.52	172	59.31	2	0.68
3	217	591,286,900	104	47.93	41	18.89	72	33.18		
4	486	856,363,800	262	53.91	51	10.49	173	35.60		
5	221	473,383,000	118	53.64	35	15.91	67	30.45	1	0.45
6	379	748,259,100	37	9.89	65	17.38	272	72.73	5	1.32
7	351	573,710,200	314	89.46	7	1.99	30	8.55		
8	542	757,992,400	120	22.18	101	18.67	320	59.15	3	0.18
9	121	361,891,100	45	37.19	39	32.23	37	30.58		
10	395	564,476,300	209	53.05	48	12.18	137	34.77	1	0.25
11	335	371,570,700	158	47.16	15	4.48	162	48.36		
12	257	463,329,400	164	63.81	46	17.90	47	18.29		
ส่วนกลาง	78	132,937,200	77	100.00					1	1.28
สพพช.	153	49,564,400	128	83.66	4	2.61	21	13.73		



2. Timeline การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567

กบร.ส.

ม.ค. 67

- 3-5 ม.ค. 67 พิจารณา วาระ 1
- 10 ม.ค. 67 แจ้งรายการร่าง พรบ. 67 เพื่อเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
- 23 ม.ค. 67 ประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารงบประมาณ ปี 67

เม.ย. 67

- 3 เม.ย. 67 สลค.นำร่างพรบ. 67 ฎลเกล้าฯ ถวายประกาศใช้เป็นกฎหมาย
- เริ่มติดตาม การส่งแผนฯ, การประกาศฯ รายการปีเดียว

ส.ค. 67

- ติดตามการลงนามสัญญา รายการผูกพัน
- ติดตามการบริหารสัญญา

พ.ย. – ธ.ค. 66

จัดทำเอกสารชี้แจงคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ

ก.พ. – มี.ค. 67

- 20-21 มี.ค. 67 สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พรบ. 67 วาระที่ 2-3
- แจ้งรายละเอียดรายการและแนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ร่าง พรบ. 67
- ติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

พ.ค. – มิ.ย. 67

- แจ้งจัดสรร เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 67
- ติดตามการลงนามสัญญารายการปีเดียว
- ประชุมติดตามงบลงทุน เขต 1-12 ครั้งที่ 1
- ลงพื้นที่ติดตามงบลงทุน

กำกับ ติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านโปรแกรมบริหารงบประมาณ

พ.ย. 66

ธ.ค. 66

ม.ค. 67

ก.พ. 67

มี.ค. 67

เม.ย. 67

พ.ค. 67

มิ.ย. 67

ก.ค. 67

ส.ค. 67

ก.ย. 67

เร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน 2566 ไปพลางก่อน ให้สอดคล้องตามแผนการใช้จ่ายฯ ที่ได้อนุมัติ

รายงานผลการดำเนินงาน ผ่านโปรแกรมบริหารงบประมาณ

ม.ค. – ก.พ. 67

- เตรียมความพร้อมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จะดำเนินการได้ต่อเมื่อ ร่าง พรบ.ผ่านอนุกรรมการฯ และมีหนังสือแจ้งเวียนจากกรมบัญชีกลาง
- จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แต่งตั้งบุคคล/ คกก.ที่เกี่ยวข้อง/ TOR/ราคากลางท้องถิ่น/spec
- ทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง/ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน และรายงานผล

เม.ย. – พ.ค. 67

- เผยแพร่ประกาศฯ /ยื่นซอง
- ประกาศผู้ชนะ/อนุมัติสั่งจ้าง
- เริ่มการลงนามสัญญารายการปีเดียว

มิ.ย. 67

รายการปีเดียว
ลงนามสัญญาแล้วเสร็จ

ก.ค. 67

รายการผูกพัน
ลงนามสัญญาแล้วเสร็จ

หน่วยรับงบประมาณ



ข้อพิจารณา

จึ้งเรียนมาเพื่อโปรด

- เร่งรัดเบิกจ่ายรายการที่กันเงินหลัอมปี 2566 ไว้ใช้จ่าย ปี 2567
- เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวทางและมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2567





Health Administration Division

กองบริหารการสาธารณสุข

ขอบคุณครับ

