



การบริหารงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

17 พฤษภาคม 2567

กรอบการนำเสนอ

- การบริการงบประมาณ 2565
- การบริหารงบลงทุนปี 2566 ที่กันเงินหลัอมปีไว้
ใช้จ่ายในปี 2567
- การบริหารงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567
และ Timeline
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 (ปี 2566 พลาังก่อน)
- การบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่
เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



การบริหารงบพิบ ปิงบประมาณ 2565

สป.สร. ใหรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
สำหรับเป็นค่าชดเชยงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ถูกพิบไป จำนวน 13 รายการ วงเงิน 138,929,400 บาท



สำนักงบประมาณ ได้นำเรื่องดังกล่าวกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว และเห็นชอบให้ สป.สร.
พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

- พิจารณาใช้เงินบำรุงโรงพยาบาล
- พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากโครงการ/รายการที่
ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย และ/หรือรายการที่หมดความจำเป็น และ/หรือรายการที่คาดว่าจะไม่
สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร แล้วแต่กรณีตามระเบียบว่า
ด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0712/5549 ลงวันที่ 26 เม.ย. 67)

ข้อเสนอ ให้พิจารณาบริหารจัดการภายในเขต One Province One Hospital



1. รายการงบประมาณปี 2566 ที่กันเงินเหลือมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2567

รายเขต

ข้อมูล GFMS ณ 1 พฤษภาคม 2567

เขต	ภาพรวม				ความเสี่ยงต่ำ		ความเสี่ยงปานกลาง		ความเสี่ยงสูง	
	จำนวน (รายการ) 1 เม.ย. 67	วงเงินคงเหลือ (ลบ.) 1 เม.ย. 67	จำนวน (รายการ) 1 พ.ค. 67	วงเงินคงเหลือ(ลบ.) 1 พ.ค. 67	จำนวน (รายการ)	วงเงินคงเหลือ (ลบ.)	จำนวน (รายการ)	วงเงินคงเหลือ (ลบ.)	จำนวน (รายการ)	วงเงินคงเหลือ (ลบ.)
รวม	165	3,017.12	146	2,599.41	2	1.89				
1	12	349.03	9	194.78			3	7.96	6	186.82
2	14	296.81	11	238.78			5	21.31	6	217.48
3	5	145.12	5	139.32			3	76.66	2	62.66
4	12	226.73	11	177.32			3	32.17	8	145.15
5	8	133.38	6	130.27			5	98.14	1	32.14
6	14	176.21	13	160.79			5	36.80	8	123.99
7	12	232.55	8	210.17			6	72.33	2	137.84
8	16	322.31	16	317.97			12	107.84	4	210.12
9	18	405.41	17	362.64	1	1.28	8	208.22	8	153.14
10	8	94.49	8	88.15	1	0.60	1	2.85	6	84.69
11	20	330.86	19	306.55			6	20.32	13	286.23
12	21	245.11	18	228.87			16	131.76	2	97.11
สพพช.	4	55.75	4	40.45			1	9.49	3	30.96
ส่วนกลาง	1	3.36	1	3.36			1	3.36		



1. รายการงบประมาณปี 2566 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2567

ก่อสร้างปีเดียว เสี่ยงสูง

ข้อมูล GFMS ณ 1 พฤษภาคม 2567

IVต	รายการ	สถานที่	เงินกันเหลื่อมปีสุทธิ ณ 2 ตุลาคม 2566	เบิกจ่าย	วงเงินกันเหลื่อมปี คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน
6	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)	รพ.สต.เจริญ ราษฎร์ จ. สมุทรปราการ	1,126,600.00	0	1,126,600.00	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 3 จาก 5 งวดงาน ขออนุมัติต่อสัญญาเช่ากับเคหะ รอเคหะอนุมัติต่อสัญญาให้ ยังไม่ อนุมัติ 2. ประเด็นปัญหา ที่ดินเป็นของเคหะ เคหะระงับการก่อสร้างเนื่องจากสัญญาเช่าหมดอายุ ไม่ได้ขออนุมัติก่อสร้างต่อ การเคหะ
6	บ้านพักข้าราชการ อำนวยความสะดวกระดับสูง	รพ.บางจาก จ. สมุทรปราการ	2,918,800.00	0	2,918,800.00	1. อยู่ระหว่างทดสอบดิน ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง 2. ประเด็นปัญหา อยู่ระหว่างทำหนังสือขออนุญาตก่อสร้าง
6	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ชำนาญการ	รพ.สต.หนองบอน จ. ระยอง	1,098,817.00	153,834.38	944,982.62	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1 จาก 5 งวดงาน 2. ประเด็นปัญหา 2.1 ผูกเหล็กไม่เรียบร้อย ให้แก้ไขให้เรียบร้อยก่อน ถึงจะส่งมอบงานได้ 2.2 วัสดุนั้นจะแพง อาจจะไม่บอกเลิกสัญญาเนื่องจากงานไม่คืบหน้า แต่ตอนนี้ผู้รับจ้างดำเนินการต่อ
6	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ชำนาญการ	รพ.สต.บ้านเขา ตาอิน จ. ระยอง	767,428.87	0	767,428.87	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงานที่ 4 จาก 5 งวดงาน 2. ประเด็นปัญหา วัสดุนั้นจะแพง
8	ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว	สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด บึงกาฬ	14,740,600.00	1,474,000.00	13,266,600.00	1. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานที่ 1 จาก 8 2. ได้รับสนับสนุนจากเงินเหลื่อมจ่าย ปี 66 เนื่องจากข้อรายการที่รับจัดสรร ไม่ตรงตามแบบแปลน จึงขอแก้ไขชื่อ รายการไปที่ สป. จึงทำให้เกิดความล่าช้า 2. สสจ. บึงกาฬ ตกลงกับผู้รับจ้างให้ดำเนินการเร่งการก่อสร้างให้เร็วขึ้น ปรับงวดงานลดระยะเวลาก่อสร้าง 3. กบร.ส. กำกับติดตามให้ดำเนินการก่อสร้าง เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน และสรุปข้อมูลเสนอ ผู้บริหาร
8	บ้านพักข้าราชการ อำนวยความสะดวกระดับสูง	โรงพยาบาลกุม ภวาปี	2,214,000.00	270,000.00	1,944,000.00	1. อยู่ระหว่างการทำงานการงวดงานที่ 3 จาก 6 2. สาเหตุความล่าช้า ผู้รับจ้างส่งสภาพคส่งทางการเงิน บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างรายเดิม 3. ได้ผู้รับจ้างรายใหม่แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในงานส่วนที่เหลือ
9	อาคารพัสดุ 2 ชั้น	โรงพยาบาลคง จ. นครราชสีมา	8,666,700.00	2,762,227.00	6,803,473.00	1. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1-2 จาก 5 งวด 2. ประเด็นปัญหา อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา เปลี่ยนแปลงฐานรากเป็นชนิดไม่ตอกเสาเข็ม (ฐานรากแผ่)
9	อาคารสถานีอนามัย 2 ชั้น	รพ.สต. ฝ่าย พญานาค จ. ชัยภูมิ	3,948,000.00	2,560,515.00	1,387,485.00	เบิกจ่ายงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 4



1. รายการรงบลงทุนปี 2566 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2567

ก่อสร้างผูกพัน เสี่ยงสูง

ข้อมูล GFMS ณ 1 พฤษภาคม 2567

เขต	รายการที่สิ้นสุดปี 67	จำนวน	วงเงินคงเหลือ
	รวม	37	1,241,697,800.04
1	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) 5 ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน	1	18,543,600.00
1	หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง) 7 ชั้น โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง	1	20,063,370.62
1	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ และบำบัดรักษา 5 ชั้น โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1	72,819,600.00
2	อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น โรงพยาบาลสวรรค์โลก จังหวัดสุโขทัย	1	15,672,949.50
3	อาคารผู้ป่วยนอก ทันตกรรม และพยาธิวิทยาคลินิก 4 ชั้น โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร	1	37,725,000.00
3	อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพิเศษและส่งเสริมสุขภาพ 5 ชั้น โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท	1	24,931,105.24
4	อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด LAB และอำนวยการ 5 ชั้น โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1	27,119,318.00
4	อาคารโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ 4 ชั้น โรงพยาบาลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี	1	9,591,700.00
5	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและผู้ป่วยใน 5 ชั้น โรงพยาบาลสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1	32,135,600.00
6	อาคารผ่าตัด อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน 5 ชั้น โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง	1	25,735,202.25
6	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น 3 ชั้น โรงพยาบาลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	1	6,413,058.63
6	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	1	26,256,433.43
7	อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก(ICU) 4 โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	1	58,108,400.00
7	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุและหัวใจ 12 ชั้น โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	79,733,422.23
8	อาคารพักคนไข้ 10 ชั้น โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร	1	8,587,140.00
8	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน 7 ชั้น โรงพยาบาลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	1	186,325,800.00
9	หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง) 7 ชั้น โรงพยาบาลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	1	30,938,800.00
9	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น ร โรงพยาบาลบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	1	12,621,138.00



2. การบริหารงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567

มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567

ให้ ใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน จำแนกรายไตรมาส ดังนี้

การใช้จ่ายงบลงทุน

ไตรมาสที่ 1	11
ไตรมาสที่ 2	24
ไตรมาสที่ 3	80
ไตรมาสที่ 4	100

1. ให้น่วยรับงบประมาณใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้โดยเร็ว ควรดำเนินการ ดังนี้

- เร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาคภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
- กรณีรายการผูกพันใหม่ ให้น่วยรับงบประมาณ จัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการ ราคากลาง และรายละเอียดประกอบที่เกี่ยวข้อง ให้ สปป. พิจารณา ความเหมาะสมของราคาควบคู่ไปกับการดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หากไม่เกินวงเงินที่ สปป. ให้ความเห็นชอบ ให้แจ้ง สปป. ทราบ และดำเนินการทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันต่อไปได้

2. กำหนดส่งมอบงานให้เร็วขึ้น

- รายการปีเดียว พิจารณา ส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้ทันเบิกจ่าย ภายใน ก.ย. 67
- รายการผูกพันใหม่ ควร ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน พ.ค. 67



2. การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567

สรุปการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พรบ. 2567 (จำแนกรายเขต)

ข้อมูล ณ 9 พฤษภาคม 2567

	พรบ. 2567		ก่อนประกาศ		ประกาศ		รอลงนาม		คืบจน	
เขต	จำนวน (หน่วย)	วงเงิน (บาท)	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	4,010	6,982,573,800	1,920	48.01	497	12.43	1,582	39.56	11	0.27
1	183	499,398,300	82	44.81	29	15.85	72	39.34		
2	292	538,411,000	102	35.17	16	5.52	172	59.31	2	0.68
3	217	591,286,900	104	47.93	41	18.89	72	33.18		
4	486	856,363,800	262	53.91	51	10.49	173	35.60		
5	221	473,383,000	118	53.64	35	15.91	67	30.45	1	0.45
6	379	748,259,100	37	9.89	65	17.38	272	72.73	1	1.32
7	351	573,710,200	314	89.46	7	1.99	30	8.55		
8	542	757,992,400	120	22.18	101	18.67	320	59.15	3	0.18
9	121	361,891,100	45	37.19	39	32.23	37	30.58		
10	395	564,476,300	209	53.05	48	12.18	137	34.77	1	0.25
11	335	371,570,700	158	47.16	15	4.48	162	48.36		
12	257	463,329,400	164	63.81	46	17.90	47	18.29		
ส่วนกลาง	78	132,937,200	77	100.00					1	1.28
สพพช.	153	49,564,400	128	83.66	4	2.61	21	13.73		



2. Timeline การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567

กบรส.

ม.ค. 67

- 3-5 ม.ค. 67 พิจารณา วาระ 1
- 10 ม.ค. 67 แจ้งรายการร่าง พรบ. 67 เพื่อเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
- 23 ม.ค. 67 ประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารงบประมาณ ปี 67

เม.ย. 67

- 3 เม.ย. 67 สลค.นำร่างพรบ. 67 ทูลเกล้าฯ ถวายประกาศใช้เป็นกฎหมาย
- เริ่มติดตาม การส่งแผนฯ, การประกาศฯ รายการปีเดียว

ก.พ. - มี.ค. 67

- 20-21 มี.ค. 67 สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พรบ. 67 วาระที่ 2-3
- แจ้งรายละเอียดรายการและแนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างร่าง พรบ. 67
- ติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

พ.ค. - มิ.ย. 67

- แจ้งจัดสรร เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 67
- ติดตามการลงนามสัญญารายการปีเดียว
- ประชุมติดตามงบลงทุน 1-12 ครั้งที่ 1
- ลงพื้นที่ติดตามงบลงทุน

ส.ค. 67

- ติดตามการลงนามสัญญา รายการผูกพัน
- ติดตามการบริหารสัญญา

พ.ย. - ธ.ค. 66

จัดทำเอกสารชี้แจงคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ



กำกับ ติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านโปรแกรมบริหารงบประมาณ

พ.ย. 66

ธ.ค. 66

ม.ค. 67

ก.พ. 67

มี.ค. 67

เม.ย. 67

พ.ค. 67

มิ.ย. 67

ก.ค. 67

ส.ค. 67

ก.ย. 67

เร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน 2566 ไปพลางก่อน ให้สอดคล้องตามแผนการใช้จ่ายฯ ที่ได้อนุมัติ

รายงานผลการดำเนินงาน ผ่านโปรแกรมบริหารงบประมาณ

ม.ค. - ก.พ. 67

- เตรียมความพร้อมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จะดำเนินการได้ต่อเมื่อร่าง พรบ. ผ่านอนุกรรมการฯ และมีหนังสือแจ้งเวียนจากกรมบัญชีกลาง
- จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แต่งตั้งบุคคล/ กกท. ที่เกี่ยวข้อง/ TOR/ราคากลางท้องถิ่น/spec
- ทำรายงานขอซื้อจ้าง/ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน และรายงานผล

เม.ย. - พ.ค. 67

- เผยแพร่ประกาศฯ /ยื่นซอง
- ประกาศผู้ชนะ/อนุมัติสั่งจ้าง
- เริ่มการลงนามสัญญารายการปีเดียว

มิ.ย. 67

รายการปีเดียว
ลงนามสัญญาแล้วเสร็จ

ก.ค. 67

รายการผูกพัน
ลงนามสัญญาแล้วเสร็จ

หน่วยรับงบประมาณ



ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรด

- เรงรัดเบิกจ่ายรายการที่กันเงินเหลือมปี 2566 ไว้ใช้จ่าย ปี 2567
- เรงรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวทางและมาตรการเรงรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- เรงรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2567




ผลการใช้จ่ายเงิน งบรายจ่ายประจำ (รายเขต)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปี2566 พลาังก่อน)

■ เบิกจ่าย+PO ■ คงเหลือ
(งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น)

เงินจัดสรร 5,994 ลบ.

เบิกจ่าย	4,915 ลบ.	82.00%
PO	- ลบ.	0.00%
เบิกจ่าย+PO	4,915 ลบ.	82.00%
คงเหลือ	1,728 ลบ.	18.00%

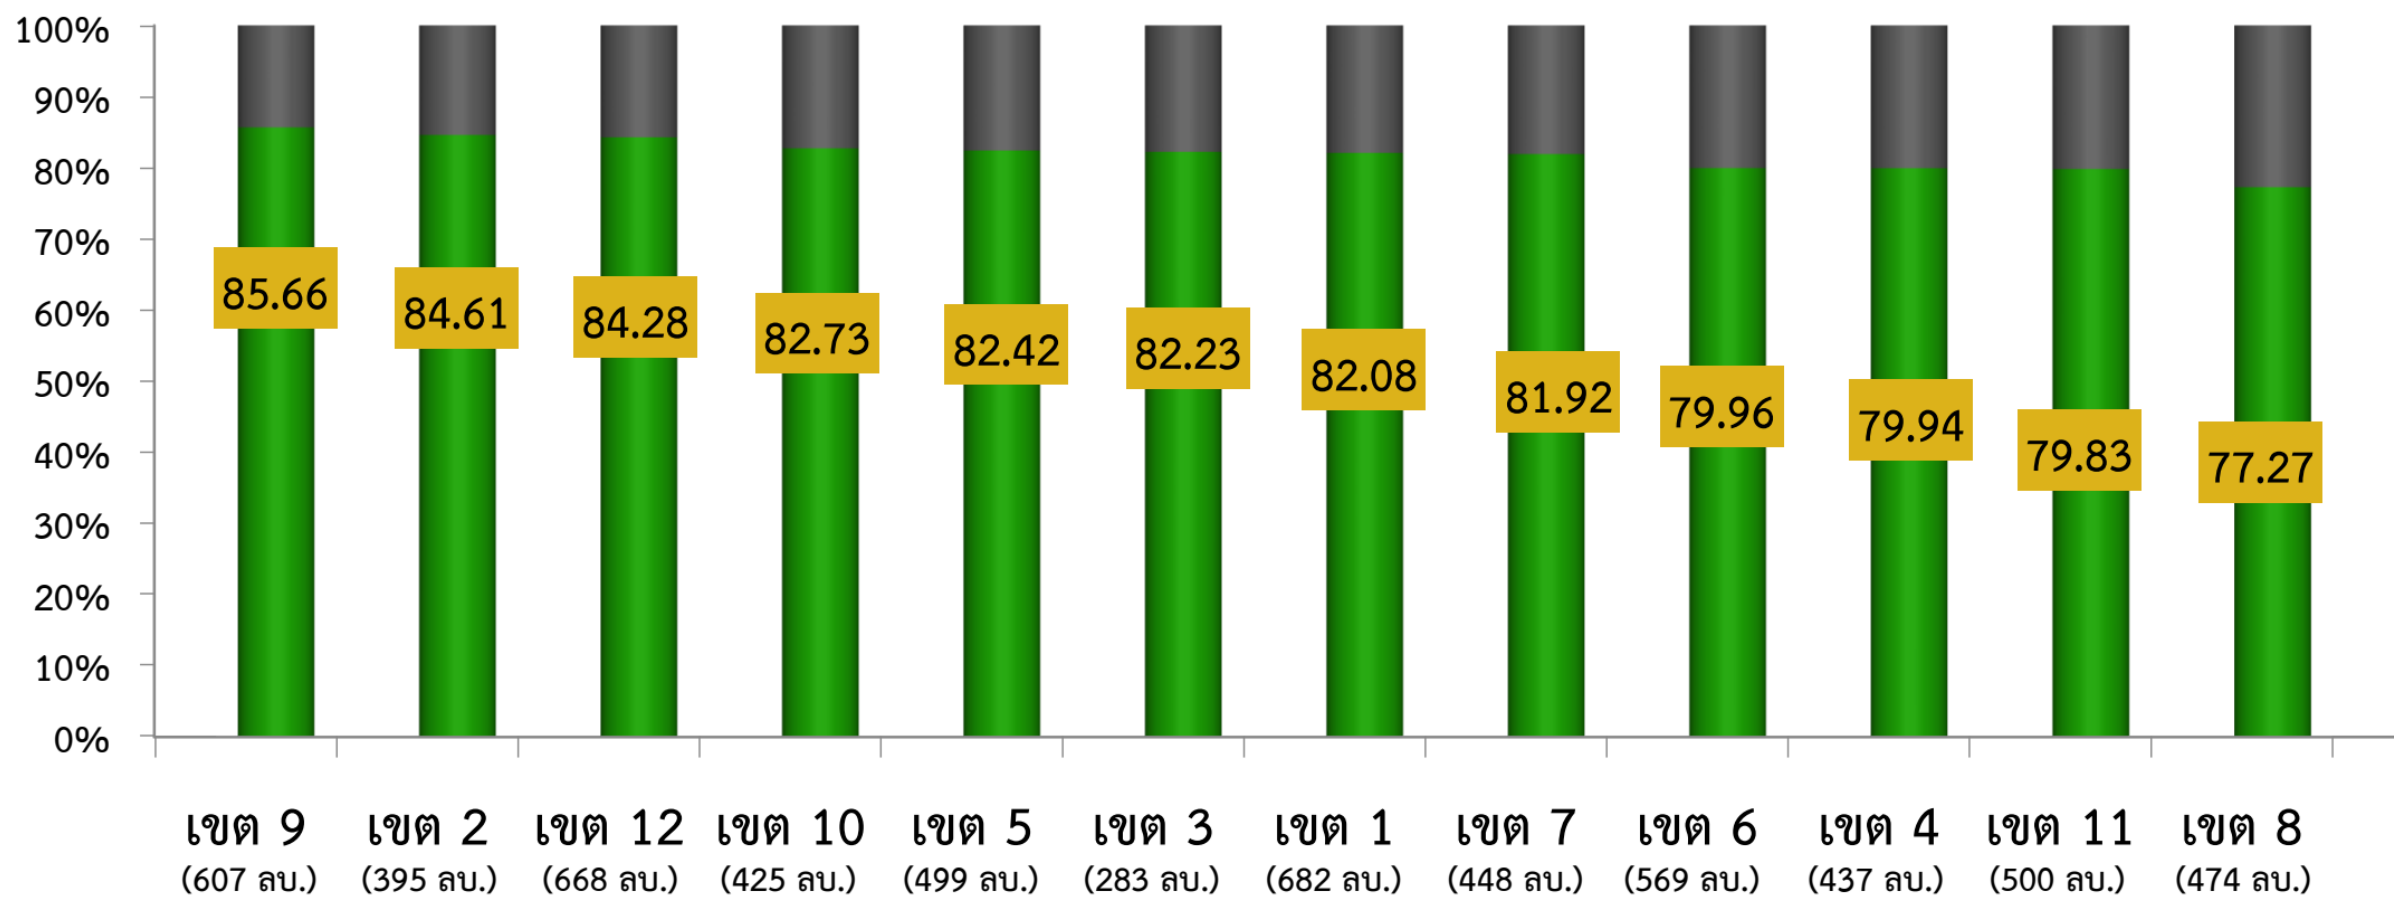


ผลการใช้จ่ายเงิน งบลงทุน รายเขต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปี2566 พลาังก่อน)

■ เบิกจ่าย+PO ■ คงเหลือ
(งบลงทุน)

เบิกจ่าย+PO

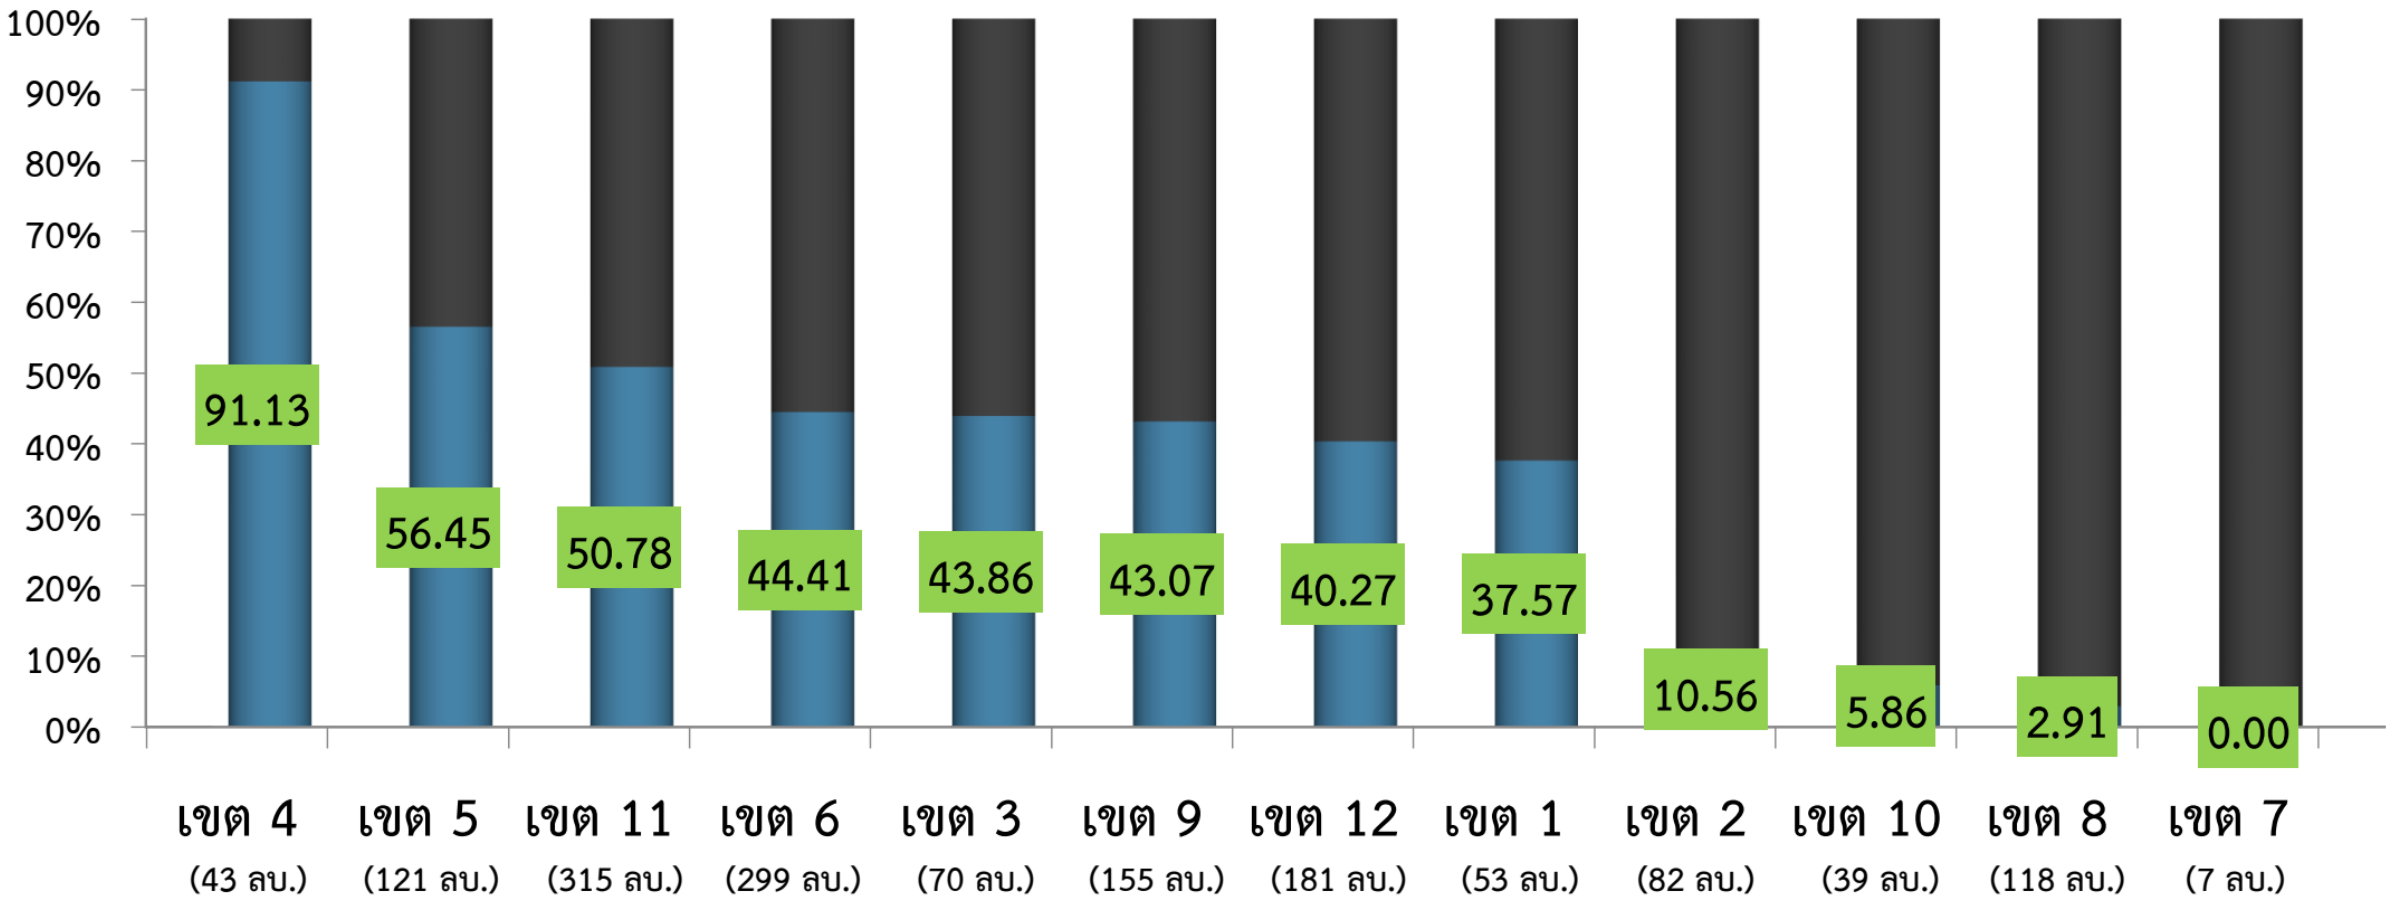

เงินจัดสรร 1,489 ลบ.

เบิกจ่าย	557 ลบ.	37.46%
PO	48 ลบ.	3.28%
เบิกจ่าย+PO	606 ลบ.	40.75%
คงเหลือ	882 ลบ.	59.25%

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เดือน	ภาพรวม	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน
	ใช้จ่ายปี67	ใช้จ่ายปี67	ใช้จ่ายปี67
ไตรมาสที่ 1 (ธันวาคม 2566)	28.00	33.00	11.00
ไตรมาสที่ 2 (มีนาคม 2567)	47.00	53.00	24.00
ไตรมาสที่ 3 (มิถุนายน 2567)	82.00	82.00	80.00
ไตรมาสที่ 4 (กันยายน 2567)	100.00	100.00	100.00

หมายเหตุ

ภาพรวม คือ ทุกงบรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายประจำ คือ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายลงทุน คือ งบลงทุน

รายงานติดตามงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เขตสุขภาพที่ 8

เขต 8	ครุภัณฑ์						สิ่งก่อสร้าง								
	จำนวนรายการ (หน่วย)	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง					จำนวนรายการ (หน่วย)	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง					กส.ปีเดียว		
		ยังไม่ ดำเนินการ	จัดทำแผน (ก่อนประกาศ)	ประกาศ	รองลงนาม	ลงนามใน สัญญา		ยังไม่ ดำเนินการ	จัดทำแผน (ก่อนประกาศ)	ประกาศ	รองลงนาม	ลงนามใน สัญญา	ปี 67	ปี 67-68	ปี 66-69
อุดรธานี	131	1	0	2	128	0	10	0	1	5	4	0	5	5	0
- สสจ.อุดรธานี	105	1			104		10		1	5	4		5	5	
- รพ.อุดรธานี	13			2	11										
- รพ.กุมภวาปี	13				13										
สกลนคร	52	0	0	31	21	0	8	0	8	0	0	0	4	4	
- สสจ.สกลนคร	33			15	18		8		8				4	4	
- รพ.สกลนคร	3				3										1 (ผพ.เดิม)
- รพ.ร.สว่างแดนดิน	7			7											
- รพ.วานรนิวาส	9			9											
นครพนม	121	0	0	0	121	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0
- สสจ.นครพนม	108				108		2		2					2	
- รพ.นครพนม	13				13										
เลย	59	0	22	5	32	0	11	0	1	7	3	0	8	2	1
- สสจ.เลย	49		21	2	26		11		1	7	3		8	2	1
- รพ.เลย	10		1	3	6										
หนองคาย	68	0	1	8	59	0	9	0	8	1	0	0	7	2	0
- สสจ.หนองคาย	16				16		8		8				7	1	
- รพ.หนองคาย	8			8			1			1				1	
- รพ.ท่าบ่อ	44		1		43										
หนองบัวลำภู	28	0	18	1	9	0	3	0	3	0	0	0	1	2	0
- สสจ.หนองบัวลำภู	24		18		6		2		2				1	1	
- รพ.หนองบัวลำภู	4			1	3		1		1					1	
บึงกาฬ	29	0	0	11	18	0	11	0	1	0	10	0	10	1	
- สสจ.บึงกาฬ	28			10	18		10				10		10		
- รพ.บึงกาฬ	1			1			1		1					1	1 (ผพ.เดิม)
รวมทั้งสิ้น	488	1	41	58	388	0	54	0	24	13	17	0	35	18	1

หมายเหตุ : ตัวเลขสีแดงมีกรณีเคลื่อนไหวข้อมูลที่ดีขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

ข้อมูลจากโปรแกรม กบรศ. ณ 17 พฤษภาคม 67 เวลา 10.00 น.

ผพ.เดิม=ก่อสร้างผูกพันเดิมของ รพ.สกลนคร อาคารพักคนไข้ 10 ชั้น / รพ.บึงกาฬ อาคารอำนวยการ OPD-ER 7 ชั้น

รายงานติดตามงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567 เขตสุขภาพที่ 8

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัด	ครุภัณฑ์						สิ่งก่อสร้าง					
หน่วยงาน	จำนวน (หน่วย)	ยังไม่ ดำเนินการ	จัดทำแผน (ก่อนประกาศ)	ประกาศ	รองลงนาม	ลงนามใน สัญญา	จำนวน (หน่วย)	ยังไม่ดำเนินการ	จัดทำแผน (ก่อนประกาศ)	ประกาศ	รองลงนาม	ลงนามใน สัญญา
สสจ.อุดรธานี	105	1*			104	–	10		1	5	4	–
รพ.อุดรธานี	13			2	11	–						
รพ.กุมภวาปี	13				13	–						

*จังหวัดอุดรธานีมีรายการยกเลิก 1 รายการ เป็นรายการที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมแล้ว สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ได้ส่งหนังสือไป กบรส.เพื่อยกเลิกรายการแล้ว วันที่ 9 พ.ค.67 จากนั้นรอให้ กบรส.นำรายการออกจากระบบต่อไป

รายการเสี่ยงสูง : บ้านพักข้าราชการ อำเภอยางชุมน้อย 2 ชั้น รพ.กุมภวาปี สาเหตุความล่าช้า ผู้รับจ้างจ้างสภาพคล่องทางการเงิน บอกลีกสัญญาผู้รับจ้างรายเดิม -ได้ผู้รับจ้างรายใหม่แล้ว เมื่อวันที่ 28 ก.พ 67 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในงานส่วนที่เหลือ -อยู่ระหว่างดำเนินการงวด 2/6 คาดว่างวด 2-3 จะเบิกจ่ายสิ้นเดือน พ.ค 67 นี้

หมายเหตุ: * หมายเหตุ : ตัวเลขสีแดงมีการเคลื่อนไหวข้อมูลที่ดีขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
หน่วยงานควรบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมบริหารงบลงทุน กบรส.ให้เป็นปัจจุบัน
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 จะติดตามรายงานทุกสัปดาห์ (วันศุกร์)

รายงานติดตามงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567 เขตสุขภาพที่ 8

จังหวัดสกลนคร

จังหวัด	ครุภัณฑ์						สิ่งก่อสร้าง					
หน่วยงาน	จำนวน (หน่วย)	ยังไม่ ดำเนินการ	จัดทำแผน (ก่อนประกาศ)	ประกาศ	รองลงนาม	ลงนามใน สัญญา	จำนวน (หน่วย)	ยังไม่ ดำเนินการ	จัดทำแผน (ก่อนประกาศ)	ประกาศ	รองลงนาม	ลงนามใน สัญญา
สสจ.สกลนคร	33			15	18	–	8		8			–
รพ.สกลนคร	3				3	–						
รพร.สว่างแดนดิน	7			7		–						
รพ.วานรนิวาส	9			9		–						

รายการเสี่ยงสูง : อาคารพักคนไข้ 10 ชั้น รพ.สกลนคร
 รพ.สกลนคร เบิกจ่ายถึงงวดที่ 11/21 เหลือเงินงวดที่เป็นเงินกัน 66 งวดที่ 12-13
 ซึ่งคาดว่าจะเบิกงวด 12-13 ได้ปลายเดือน พ.ค.67 และจะเบิกจ่ายงวด 14/21 ภายใน มิ.ย.67 นี้
 (ซึ่งบเงินกัน 66 ก็จะเบิกหมด)

หมายเหตุ: * หมายเหตุ : ตัวเลขสีแดงมีการเคลื่อนไหวข้อมูลที่ดีขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
 หน่วยงานควรบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมบริหารงบลงทุน กบรส.ให้เป็นปัจจุบัน
 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 จะติดตามรายงานทุกสัปดาห์ (วันศุกร์)

รายงานติดตามงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567 เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดนครพนม

จังหวัด		ครุภัณฑ์					สิ่งก่อสร้าง					
หน่วยงาน	จำนวน (หน่วย)	ยังไม่ ดำเนินการ	จัดทำแผน (ก่อนประกาศ)	ประกาศ	รองลงนาม	ลงนามใน สัญญา	จำนวน (หน่วย)	ยังไม่ ดำเนินการ	จัดทำแผน (ก่อนประกาศ)	ประกาศ	รองลงนาม	ลงนามใน สัญญา
สสจ.นครพนม	108				108	-	2		2			-
รพ.นครพนม	13				13	-						

หมายเหตุ: * หมายเหตุ : ตัวเลขสีแดงมีการเคลื่อนไหวข้อมูลที่ดีขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
 หน่วยงานควรบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมบริหารงบลงทุน กบรส.ให้เป็นปัจจุบัน
 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 จะติดตามรายงานทุกสัปดาห์ (วันศุกร์)

รายงานติดตามงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567 เขตสุขภาพที่ 8

จังหวัดเลย

จังหวัด	ครุภัณฑ์						สิ่งก่อสร้าง					
หน่วยงาน	จำนวน (หน่วย)	ยังไม่ ดำเนินการ	จัดทำแผน (ก่อนประกาศ)	ประกาศ	รองลงนาม	ลงนามใน สัญญา	จำนวน (หน่วย)	ยังไม่ ดำเนินการ	จัดทำแผน (ก่อนประกาศ)	ประกาศ	รองลงนาม	ลงนามใน สัญญา
สสจ.เลย	49		21	2	26	–	11		1	7	3	–
รพ.เลย	10		1	3	6	–						

หมายเหตุ: * หมายเหตุ : ตัวเลขสีแดงมีการเคลื่อนไหวข้อมูลที่ดีขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
หน่วยงานควรบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมบริหารงบลงทุน กบรส.ให้เป็นปัจจุบัน
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 จะติดตามรายงานทุกสัปดาห์ (วันศุกร์)

รายงานติดตามงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567 เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดหนองคาย

จังหวัด		ครุภัณฑ์					สิ่งก่อสร้าง					
หน่วยงาน	จำนวน (หน่วย)	ยังไม่ ดำเนินการ	จัดทำแผน (ก่อนประกาศ)	ประกาศ	รองลงนาม	ลงนามใน สัญญา	จำนวน (หน่วย)	ยังไม่ ดำเนินการ	จัดทำแผน (ก่อนประกาศ)	ประกาศ	รองลงนาม	ลงนามใน สัญญา
สสจ.หนองคาย	16				16	-	8		8			-
รพ.หนองคาย	8			8		-	1			1		-
รพร.ท่าบ่อ	44		1		43	-						

หมายเหตุ: * หมายเหตุ : ตัวเลขสีแดงมีการเคลื่อนไหวข้อมูลที่ดีขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
 หน่วยงานควรบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมบริหารงบลงทุน กบรส.ให้เป็นปัจจุบัน
 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 จะติดตามรายงานทุกสัปดาห์ (วันศุกร์)

รายงานติดตามงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567 เขตสุขภาพที่ 8

จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัด	ครุภัณฑ์						สิ่งก่อสร้าง					
หน่วยงาน	จำนวน (หน่วย)	ยังไม่ ดำเนินการ	จัดทำแผน (ก่อนประกาศ)	ประกาศ	รองลงนาม	ลงนามใน สัญญา	จำนวน (หน่วย)	ยังไม่ ดำเนินการ	จัดทำแผน (ก่อนประกาศ)	ประกาศ	รองลงนาม	ลงนามใน สัญญา
สสจ.หนองบัวลำภู	24		18		6	-	2		2			-
รพ.หนองบัวลำภู	4			1	3	-	1		1			-

หมายเหตุ: * หมายเหตุ : ตัวเลขสีแดงมีการเคลื่อนไหวข้อมูลที่ดีขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
หน่วยงานควรบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมบริหารงบลงทุน กบรส.ให้เป็นปัจจุบัน
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 จะติดตามรายงานทุกสัปดาห์ (วันศุกร์)

รายงานติดตามงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567 เขตสุขภาพที่ 8

จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัด	ครุภัณฑ์						สิ่งก่อสร้าง						สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม	
หน่วยงาน	จำนวน (หน่วย)	ยังไม่ ดำเนินการ	จัดทำแผน (ก่อนประกาศ)	ประกาศ	รองลงนาม	ลงนามใน สัญญา	จำนวน (หน่วย)	ยังไม่ ดำเนินการ	จัดทำแผน (ก่อนประกาศ)	ประกาศ	รองลงนาม	ลงนามใน สัญญา	ผูกพัน ปี 66-67	ผูกพัน ปี 66-68
สสจ.บึงกาฬ	28			10	18	-	10				10		-	-
รพ.บึงกาฬ	1			1		-	1		1				-	1

รายการเสี่ยงสูง : อาคารอำนวยการ OPD-ER 7 ชั้น รพ.บึงกาฬ
ประเด็นปัญหาความล่าช้า ผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทาง
การเงิน ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างรายใหม่แล้วลงนามสัญญาใหม่แล้ว เมื่อ 22 มี.ค. 67 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 0/23

รายการเสี่ยงสูง : อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง) 3 ชั้น สสจ.บึงกาฬ
ตอนนี้ดำเนินการงวด 2/8 คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือน พ.ค 67

หมายเหตุ: * หมายเหตุ : ตัวเลขสีแดงมีการเคลื่อนไหวข้อมูลที่ดีขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
หน่วยงานควรบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมบริหารงบลงทุน กบรส.ให้เป็นปัจจุบัน
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 จะติดตามรายงานทุกสัปดาห์ (วันศุกร์)

รายงานติดตามงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566 เขตสุขภาพที่ 8

รายการเสี่ยงสูง


ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	วงเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	งวดงาน	หมายเหตุ
1	บ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับสูง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร โรงพยาบาลกุมภวาปี ตำบลกุมภวาปี	รพ.กุมภวาปี	2,214,000	270,000	1,944,000	2/6	สาเหตุความล่าช้า ผู้รับจ้างจ้างสภาพคล่องทางการเงิน บอกลีกสัญญา ผู้รับจ้างรายเดิม ได้ผู้รับจ้างรายใหม่แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในงานส่วนที่เหลือ ได้ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 28 ก.พ 67 คาดว่าจะงวด 2-3 จะเบิกจ่ายสิ้นเดือน พ.ค 67
2	อาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,206 ตารางเมตร โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร	รพ.สกลนคร	33,247,160	24,660,020	8,587,140	11/21	รพ.สกลนคร เบิกจ่ายถึงงวดที่11 เหลือเงินงวดที่เป็นเงินกัน 66 งวด 12-13 ซึ่งคาดว่าจะเบิกงวด12-13 ได้ปลายเดือน พ.ค.67 และจะเบิกจ่ายงวด14ภายใน มิ.ย นี้เงินกัน 66 ก็จะเบิกหมด
3	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 23,765 ตารางเมตรโรงพยาบาลบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ	รพ.บึงกาฬ	186,325,800	0	186,325,800	0/23	ประเด็นปัญหา บอกลีกสัญญา ผู้รับจ้างรายเดิม เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างรายใหม่แล้วลงนามสัญญาใหม่แล้ว เมื่อ 22 มี.ค. 67
4	อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 819 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ จังหวัดบึงกาฬ	สสจ.บึงกาฬ	14,740,500	1,474,000	13,266,500	1/8	ตอนนี้ดำเนินการงวด 2 คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือน พ.ค 67

รายการลงทุนที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งบลงทุนที่คาดว่าจะถูกพับ 45,313,000 บาท ของ รพ.บึงกาฬ)


ลำดับ	เขต	จังหวัด	รายการ	วงเงิน	หมายเหตุ
1	11	สุราษฎร์ธานี	ก่อสร้างอาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,772 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่างานก่อสร้าง งวดที่ 11-12	11,459,700	ก่อสร้างอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,765 ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง
2	5	สุพรรณบุรี	ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,721 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีประจันต์ ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่างานก่อสร้าง งวดที่ 12 (ส่วนที่ค้างจ่าย)	1,888,500	ก่อสร้างอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 23,765 ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงกาฬตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง
3	9	สุรินทร์	ก่อสร้างอาคารจอดรถ 1 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 16,603 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่างานก่อสร้าง งวดที่ 7-8 (ส่วนที่ค้างจ่าย)	11,922,750	ก่อสร้างอาคารอำนวยการและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 23,765 ตารางเมตร โรงพยาบาลตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง
			รวมเป็นเงิน (บาท)	25,270,950	(คงเหลือ 20,042,050 บาท)

การบริหารจัดการงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) เขตสุขภาพที่ 8

ผลการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 เขตสุขภาพที่ 8

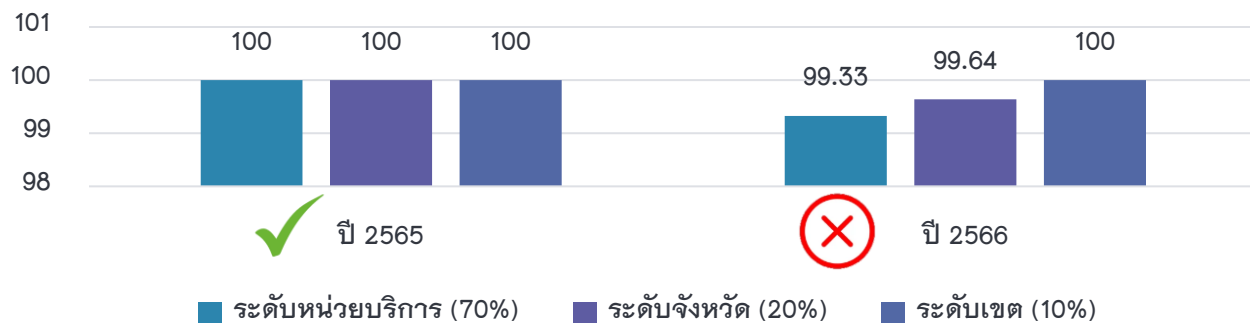

จำนวนวงเงินและร้อยละการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ในสังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขตสุขภาพที่ 8

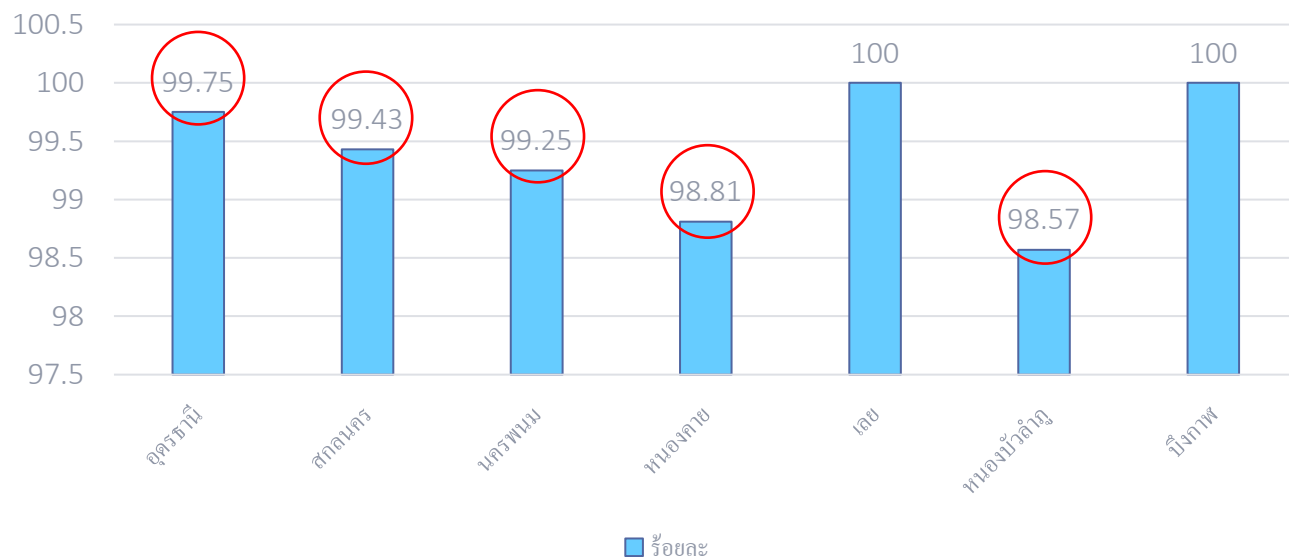

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค. 67 เวลา 16.00 น. สปสธ. เขต 8 อุดรธานี รายงานโดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (R8-CIO)

การจัดสรร งบค่าเสื่อม เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2566

ภาพรวมการจัดสรร วงเงินทั้งสิ้น **534,528,080.24** บาท

รายการ	70%	20%	10%
จัดสรร	374,169,656.19 (2,084 รายการ)	106,905,616.08 (560 รายการ)	53,452,807.97 (220 รายการ)
เบิกจ่าย	351,668,597.30 (2,070 รายการ)	105365616.08 (558 รายการ)	53452807.97 (220 รายการ)
คงเหลือ	374,169,656.19 (14 รายการ) นครพนม 3,สกลนคร 3 หนองคาย 4,อุดรธานี 2 หนองบัวลำภู 4	1,540,000.00 (2 รายการ) หนองบัวลำภู 2	

ผลการดำเนินงาน

- ปี 2565 เขต 8 เบิกจ่าย ร้อยละ 100
- ปี 2566 เขต 8 ระดับเขต ร้อยละ 100 ระดับจังหวัด ร้อยละ 99.64 และระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 99.33
- หน่วยงานที่เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 5 จังหวัด 16 รายการ ได้แก่ จ.หนองบัวลำภู 4 รายการ, จ.นครพนม 3 รายการ, จ.สกลนคร 3 รายการ , จ.หนองคาย 4 รายการ, จ.อุดรธานี 2 รายการ **ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย**

*** แผนค่าของงบค่าเสื่อมปี 2567** อยู่ระหว่างบันทึกแผนค่าขอส่ง สปสธ.เขต 8 อุดรธานี



การบริหารจัดการงบประมาณบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)

จังหวัด	หน่วยบริการแม่ข่าย	หน่วยบริการลูกข่าย	ประเภท	รายการ	จำนวน	รวมเงิน	งบค่าเสื่อมUC เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ การดำเนินการ	งบ (ระดับ)
อุดรธานี	รพ.อุดรธานี	รพ.อุดรธานี	ก่อสร้าง	ซ่อมแซมระบบปรับอากาศ งาน พื้นและประตูสำหรับห้องผ่าตัด จำนวน 4 ห้อง	1	12,461,862.00	0	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว	หน่วยบริการ 70%
อุดรธานี	รพ.อุดรธานี	รพ.อุดรธานี	ก่อสร้าง	ซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยางโชน ทางเดินห้องผ่าตัด ตึกเชี่ยวชาญ ชั้น 5	1	764,710.00	0	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว	หน่วยบริการ 70%
สกลนคร	รพ.สกลนคร	รพ.สกลนคร	ครุภัณฑ์	เครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาดไม่น้อย กว่า 150 แรงม้า	1	3,000,000.00	0	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	หน่วยบริการ 70%
สกลนคร	รพ.สกลนคร	รพ.สกลนคร	ครุภัณฑ์	เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน	1	2,200,000.00	0	ทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับ	หน่วยบริการ 70%
สกลนคร	รพ.สกลนคร	รพ.สกลนคร	ครุภัณฑ์	กล่องส่องตรวจกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดี ทัศน์แบบคมชัด พร้อมชุด ควบคุมสัญญาณภาพ	1	2,000,000.00	0	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	หน่วยบริการ 70%
นครพนม	รพ.นครพนม	รพ.สต.หนองญาติ	ก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตพื้นที่ 130 ตรม.	1	112,500.00	0	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	หน่วยบริการ 70%
นครพนม	รพ.นาหว้า	รพ.สต.บ้านนาคุณใหญ่ (ถ่ายโอน)	ก่อสร้าง	ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล็อก	1	103,040.00	0	จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว	หน่วยบริการ 70%
นครพนม	รพ.วังยาง	รพ.สต.หนองโพธิ์ (ถ่ายโอน)	ก่อสร้าง	ซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.หนอง โพธิ์	1	375,000.00	0	จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว	หน่วยบริการ 70%



การบริหารจัดการงบประมาณบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)

จังหวัด	หน่วยบริการแม่ข่าย	หน่วยบริการลูกข่าย	ประเภท	รายการ	จำนวน	รวมเงิน	งบค่าเสื่อมUC เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ การดำเนินการ	งบ (ระดับ)
หนองคาย	รพ.หนองคาย	รพ.หนองคาย	ครุภัณฑ์	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง	9	1,350,000.00	1,347,300.00	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างตรวจรับ	หน่วยบริการ 70%
หนองคาย	รพ.ศรีเชียงใหม่	รพ.ศรีเชียงใหม่	สิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม Type B	1	98,300.00	0	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว อยู่ในระหว่างทำสัญญา	หน่วยบริการ 70%
หนองคาย	รพ.ศรีเชียงใหม่	รพ.ศรีเชียงใหม่	สิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมห้องบัตรและผู้ป่วยนอก	1	496,400.00	0	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว อยู่ในระหว่างทำสัญญา	หน่วยบริการ 70%
หนองคาย	รพ.ศรีเชียงใหม่	รพ.ศรีเชียงใหม่	สิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมห้องเจาะเลือด	1	90,600.00	0	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว อยู่ในระหว่างทำสัญญา	หน่วยบริการ 70%
หนองบัวลำภู	รพ.ศรีบุญเรือง	รพ.ศรีบุญเรือง (ถ่ายโอน)	ครุภัณฑ์	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด 1 ประตู	1	840,000.00	0	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	ระดับหน่วยบริการ 70%
หนองบัวลำภู	รพ.หนองบัวลำภู	รพ.สต.บ้านนาคำไฮ (ถ่ายโอน)	สิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมห้องน้ำผู้พิการ	1	50,000.00	0	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	ระดับหน่วยบริการ 70%
หนองบัวลำภู	รพ.ศรีบุญเรือง	รพ.ศรีบุญเรือง	ครุภัณฑ์	เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร	1	790,000.00	0	ทำสัญญาแล้ว อยู่ในระหว่างตรวจรับ	จังหวัด 20%
หนองบัวลำภู	รพ.นาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	รพ.นาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	ครุภัณฑ์	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 100 กิโลวัตต์	1	750,000.00	0	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	จังหวัด 20%

Thank You

