



ติดตามการบริหารงบประมาณ ปี 2567-2568 เขตสุขภาพที่ 8

24 ธันวาคม 2568

สรุปรายการงบประมาณ ปี 2567 - 2568 ค่าเช่า/เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

เขตสุขภาพที่ 8 รวม 25 รายการ

- อุดรธานี จำนวน 4 รายการ
- สกลนคร จำนวน 3 รายการ
- นครพนม จำนวน 2 รายการ
- เลย จำนวน 2 รายการ
- หนองคาย จำนวน 7 รายการ
- หนองบัวลำภู จำนวน 4 รายการ
- บึงกาฬ จำนวน 3 รายการ



*** ขอให้ผู้บริหาร เร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง ***

BACK UP

รายการงบประมาณ 2567-2568 จังหวัดอุดรธานี

ลำข้า 4 รายการ : รพร.บ้านดุง 1, รพ.ศรีธาตุ 1, รพ.หนองหาน 1, รพ.อุดรธานี
เร่งรัด กำกับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง : รพ.อุดรธานี อาคารผู้ป่วยนอก 9 ชั้น

ปีงบประมาณ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	ชื่อสถานที่	จังหวัด	เหลือปี 68	รับโอนปี 69	งวดงาน ทั้งหมด	คาดว่าจะส่ง มอบ	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	เหตุความล่าช้า
2567-2569	ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 819 ตารางเมตร	14,068,500.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง	อุดรธานี	1,652,007	3,738,200	8	ธ.ค.68	ธ.ค.68	- ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 8 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.68 - นัดตรวจรับงานวันที่ 24 ธ.ค.68 คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน ธ.ค.68
2568	อาคารจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 336 ตารางเมตร	9,849,500.00	โรงพยาบาลศรีธาตุ	อุดรธานี	6,719,760	-	6	14 พ.ย.68	ธ.ค.68	- ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 5 และ 6 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.68 - อยู่ระหว่างผู้ควบคุมงานตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนนัดตรวจรับ เป็นไปตามงวดงาน
2567-2569	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร	188,039,000.00	โรงพยาบาลหนองหาน	อุดรธานี	22,196,940	65,923,100	12	21 ก.ค.69	ส.ค.69	- แล้วเสร็จ 6 งวด - ส่งมอบงานงวดที่ 7 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.68 - นัดตรวจรับงานวันที่ 23 ธ.ค.68 เป็นไปตามงวดงาน
2568-2570	อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.9 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 31,420 ตารางเมตร	537,170,000.00	โรงพยาบาลอุดรธานี	อุดรธานี	107,434,000	67,434,000	34	22 ส.ค.71	ก.ย.71	- ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ในวันที่ 20 ธ.ค.68 เป็นไปตามงวดงาน

รายการงบประมาณ 2567-2568 จังหวัดสกลนคร

ล่าช้า 3 รายการ : รพ.พระอาจารย์มั่นฯ 1, รพ.พังโคน 2

เร่งรัด กำกับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง : รพ.พังโคน อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน บำบัดรักษาและสำนักงาน 5 ชั้น

ปีงบประมาณ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	ชื่อสถานที่	จังหวัด	เหลือปี 68	รับโอนปี 69	งวดงานทั้งหมด	คาดว่าจะส่งมอบ	เดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	เหตุความล่าช้า
2567-2569	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร	69,279,600.00	โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต	สกลนคร	21,938,900	36,948,700	10	5 ก.ย.69	ก.ย.69	- ลงนามแล้ว พ.ค.68 - ส่งมอบงานงวด 1-3 วันที่ 12 ธ.ค.68 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย - ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 4
2567-2570	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน บำบัดรักษาและสำนักงาน เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,600 ตารางเมตร	324,800,000.00	โรงพยาบาลพังโคน	สกลนคร	14,436,100	2,206,600	-	-	-	- ปี 67 ผู้เสนอราคารายที่ 1 ไม่ยื่นราคา ทำให้ล่าช้า ถูกพับงบไป (48 ลบ.) ได้ประสาน กบรส.ตั้งงบประมาณในส่วนที่ถูกพับไปและขยายเวลาถึงปี 2571 - ปัจจุบันปี 68 ได้ผู้ชนะแล้ว - อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอ ผวจ. ลงนามสัญญาจ้าง
2568-2570 (ขอขยาย70)	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร	108,861,600.00	โรงพยาบาลพังโคน	สกลนคร	21,772,400	16,039,600	14	15 ก.ย.70	ก.ย.70	- ลงนามล่าช้าทำให้ก่อสร้างล่าช้า ปัจจุบันดำเนินงานงวดที่ 1 งานเสาเข็ม, ผลเจาะดินจาก สบส ล่าช้า, ติดฤดูฝน เมื่อวันที่ 27 พ.ย.68 ประชุมแก้ไขสัญญาคืนเงินเสาเข็ม เสนอ ผวจ. เพื่ออนุมัติคืนเงินเสาเข็มแล้ว - คาดว่าส่งงานและเบิกจ่าย งวดที่ 1 ภายใน ธ.ค.68

รายการงบประมาณ 2567-2568 จังหวัดนครพนม

ล่าช้า 2 รายการ : รพ.ศรีสงคราม 1, รพ.นาหว้า 1

เร่งรัด กำกับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง : รพ.วังนาหว้า หอผู้ป่วยนอก 3 ชั้น

ปีงบประมาณ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	ชื่อสถานที่	จังหวัด	เหลือปี 68	รับโอนปี 69	งวดงาน ทั้งหมด	คาดว่าจะส่ง มอบ	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	เหตุความล่าช้า
2567-2569	อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,508 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	45,798,800.00	โรงพยาบาลศรีสงคราม	นครพนม	19,846,300	21,219,800	8	มิ.ย.69	ก.ค.69	งบปี 67 กันเหลื่อม 2568 มี 2 งวดงาน วงเงิน 6,869,900 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 14 มี.ค.68 สิ้นสุดสัญญา 11 มี.ค. 69 เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 2,396,800 บาท เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2568, งวดที่ 2 จำนวน 4,473,100 บาท เนื่องจากที่มีปัญหาในเรื่องเทคนิคการก่อสร้าง เพราะอยู่ในช่วงฤดูฝนทำให้การดำเนินงานก่อสร้างล่าช้า จึงทำให้งบถูกพับ ทั้งนี้ กบรส. ได้ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงให้ รพ.พระอาจารย์ฝั้น จ.สกลนคร ใช้ต่อแล้ว จำนวน 2,763,020 บาท จึงต้องใช้เงินบำรุงเงินเดิมอีก จำนวน 1,710,080 บาท - ณ ปัจจุบัน ตรวจรับงวดงานที่ 2 เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2568 อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดงานที่ 2 และดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 3
2567-2569	อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	70,059,100.00	โรงพยาบาลนาหว้า	นครพนม	22,186,000	32,716,200	10	ก.ค.70	ส.ค.70	- ปีงบ 67 กันเหลื่อม 68 จำนวน 10,508,900 บาท ไม่สามารถเบิกจ่ายได้แล้วถูกพับทั้งหมด ทั้งนี้ กบรส. แฉงจะจัดทำแผนตั้งงบใหม่ให้ถึงปี 2570 - ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1 แต่พบปัญหาเรื่องการตอกเสาเข็ม ผู้เชี่ยวชาญจากกองแบบลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว อยู่ระหว่างรอข้อแนะนำว่าสามารถดำเนินการเจาะได้หรือไม่

รายการงบประมาณ 2567-2568 จังหวัดเลย

ล่าช้า 2 รายการ : รพ.วังสะพุง 1, รพ.นาด้วง 1

เร่งรัด กำกับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง : รพ.วังสะพุง หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง)/ รพ.นาด้วง อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1 ชั้น

ปีงบประมาณ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	ชื่อสถานที่	จังหวัด	เหลือปี 68	รับโอนปี 69	งวดงานทั้งหมด	คาดว่าจะส่งมอบ	เดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	เหตุความล่าช้า
2567-2569 ขอขยาย 70	หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง)	157,166,600.00	โรงพยาบาลวังสะพุง	เลย	7,381,900	20,418,500	20	7 ธ.ค.69		- ปี 2567 วงเงิน 23,575,000 บาท สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ก.ย. 2568 จำนวน 2 งวดงานถูกพับบ 9,301,100.06 บาท กบรส. ทำเรื่องโอนเปลี่ยนแปลงแล้วให้โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายการอาคารผู้ป่วยนอก วงเงิน 9,700,430 บาท - อยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดที่ 5/7 (ปี68) - ผู้รับจ้างได้รับการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไป จำนวน 44 วัน สิ้นสุดวันที่ 18 ก.พ.69
2568-2569	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคารคสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	10,476,600.00	โรงพยาบาลนาด้วง	เลย	6,603,810	4,156,300	8	ธ.ค.69	ธ.ค.69	- อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 4 - คาดว่าจะส่งมอบงานได้ใน ธ.ค.69

รายการงบประมาณ 2567-2568 จังหวัดหนองคาย

ลำข้า 7 รายการ : รพ.รัตนวาปี 2, รพ.เฝ้าไร่ 1, รพ.ศรีเชียงใหม่ 1, รพ.โพนพิสัย 1, รพ.ท่าบ่อ 1, รพ.หนองคาย 1

เร่งรัด กำกับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง : รพ.โพนพิสัย อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น

ปีงบประมาณ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	ชื่อสถานที่	จังหวัด	เหลือปี 68	รับโอนปี 69	งวดงานทั้งหมด	คาดว่าจะส่งมอบ	เดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	เหตุความล่าช้า
2568	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น	2,109,200.00	โรงพยาบาลรัตนวาปี	หนองคาย	1,506,960	-	5	4 พ.ย.68	ธ.ค.68	- อยู่ระหว่าง คกก.ตรวจรับงานงวดที่ 4 - สิ้นสุดสัญญา มีค่าปรับ
2568	อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพ (ระดับปฐมภูมิ) เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น	13,481,000.00	โรงพยาบาลรัตนวาปี	หนองคาย	13,479,000	-	6	24 มิ.ย.69	มิ.ย.69	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ 2
2568	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ ข้าราชการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น	1,600,500.00	โรงพยาบาลเฝ้าไร่	หนองคาย	1,449,000	-	5	4 พ.ย.68	ธ.ค.68	- อยู่ระหว่าง คกก.ตรวจรับงานงวดที่ 4 - 5 - สิ้นสุดสัญญา มีค่าปรับ
2567	ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น	14,901,200.00	โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่	หนองคาย	1,687,300	3,597,400	8	ธ.ค.68	ธ.ค.68	- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 8 งวดสุดท้าย
2562-2568	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ ICU ขนาด 10 ชั้น	743,482,100.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	หนองคาย	51,788,559	-	19	ธ.ค.68	ธ.ค.68	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ 19 - สิ้นสุดสัญญา มีค่าปรับ เนื่องจากเลยระยะเวลาส่งงาน พ.ย.68
2568-2570	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น	75,239,200.00	โรงพยาบาลโพนพิสัย	หนองคาย	15,047,900	15,048,100	15	10 มี.ค.70	มี.ค.69 (เงินกันเหลือปี 68 มี 5 งวดงาน)	- นัดตรวจรับงานงวดที่ 1 วันที่ 17 ธ.ค.68
2567-2569	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง 7 ชั้น		โรงพยาบาลหนองคาย	หนองคาย	-	47,108,500	15	23 เม.ย.69	เม.ย.69	- ส่งมอบแล้ว 12 งวดงาน - ส่งมอบงานงวดที่ 12 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.68 - นัดตรวจรับมอบงานงวดที่ 12 ในวันที่ 17 ธ.ค.68 - อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 13 - 15 (สุดท้าย)

รายการงบประมาณ 2567-2568 จังหวัดหนองบัวลำภู

ล่าช้า 4 รายการ : รพ.หนองบัวลำภู 1, รพ.สุวรรณคูหา 2, รพ.โนนสัง 1

เร่งรัด กำกับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง : รพ.สุวรรณคูหา อาคารทันตกรรม 8 ยูนิต 1 ชั้น

ปีงบประมาณ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	ชื่อสถานที่	จังหวัด	เหลือปี 68	รับโอนปี 69	งวดงาน ทั้งหมด	คาดว่าจะส่ง มอบ	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ	เหตุความล่าช้า
2567-2569	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 936 ตารางเมตร	30,235,500.00	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	13,102,500	12,597,600	8	มี.ค.69	6 เม.ย.69	- ล่าช้า 4 งวด - ขอกันเงินเบิกจ่ายในปี 69 เรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 4 - 5 - สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนด
2568-2570	อาคารทันตกรรม 8 ยูนิต เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 766 ตารางเมตร	25,147,900.00	โรงพยาบาลสุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	5,029,600	10,506,300	-	-	-	- สัญญาเรียบร้อยแล้ว 12 ธ.ค.68 - รอส่งมอบพื้นที่
2568-2570	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,724 ตารางเมตร	25,154,400.00	โรงพยาบาลสุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	7,198,600	11,872,400	10	23 ธ.ค.68	ม.ค.69	- ส่งมอบงวดที่ 5 - 6 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 7 - 10 ผู้รับเหมาแจ้งคาดว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนดใน สัญญา
2568-2569	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 576 ตารางเมตร	8,596,400.00	โรงพยาบาลโนนสัง	หนองบัวลำภู	7,777,000	-	6	21 เม.ย.69	พ.ค.69	- ผู้รับจ้างส่งงานมอบงานงวดที่ 1 - อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 2

รายการลงทุน 2567-2568 จังหวัดบึงกาฬ

ล่าช้า 3 รายการ : รพ.บึงกาฬ 2 , รพ.เซกา 1
เร่งรัด กำกับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง : รพ.บึงกาฬ อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน 7 ชั้น

ปีงบประมาณ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	ชื่อสถานที่	จังหวัด	เหลือปี 68	รับโอนปี 69	งวดงานทั้งหมด	คาดว่าจะส่งมอบ	เดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	เหตุความล่าช้า
2563-2570	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,765 ตาราง	393,947,100.00	รพ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	58,591,758.75	20,177,500	23	18 ต.ค.69		- ส่งมอบงานตามสัญญา 18 ต.ค.69 - เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องในการทำงาน จึงทำให้งานล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนงาน - ปัจจุบันดำเนินงาน งวดที่ 11 คาดว่าจะส่งมอบงาน งวดที่ 11 ในวันที่ 6 ม.ค.2569
2567-2569	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น	140,096,333.00	รพ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	-	83,921,400	14	5 มี.ค.69	มี.ค.69	- เป็นไปตามงวดงานปัจจุบันแล้ว - ส่งมอบงวดที่ 11 เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.68 - ปัจจุบันดำเนินการอยู่ในงวดที่ 12/14 ดำเนินการเร็วกว่าสัญญาจ้าง 14 วัน
2568-2569	อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 819 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	15,375,400.00	รพ.เซกา	บึงกาฬ	635,284.63	6,578,500	8	20 ก.พ.69	ก.พ.69	- ส่งมอบงวดงาน 4 แล้ว เบิกจ่ายงวดที่ 4 จำนวนเงิน 1,737,600 บาท (เงินกันเหลือปี 68 จำนวน 635,284.63 บาท + เงินงบประมาณ 2569 จำนวน 1,102,315.37บาท) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 - อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 5 – 6



ติดตามการบริหารงบประมาณ (การจัดซื้อจัดจ้าง) ปี 2569 เขตสุขภาพที่ 8

24 ธันวาคม 2568

รายงานติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ก่อนประกาศ :

- **ครุภัณฑ์ 29 รายการ** ได้แก่ อุดรธานี 1/ สกลนคร 6/ นครพนม 1/ หนองคาย 18/ หนองบัวลำภู 1/ บึงกาฬ 2
- **สิ่งก่อสร้าง 8 รายการ** ได้แก่ อุดรธานี 2/ สกลนคร 1/ นครพนม 1/ หนองคาย 1/ หนองบัวลำภู 2/ บึงกาฬ 1

หน่วยงาน	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์						ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง สิ่งก่อสร้าง						
	จำนวน (หน่วย)	ก่อนประกาศ		ประกาศ			จำนวน (หน่วย)	ก่อนประกาศ			ประกาศ		
		แต่งตั้ง คกก. จัดทำ TOR	ร่างประกาศ/ เผยแพร่ ประกาศ	ประกาศ ผู้ชนะ	รองลงนาม	ลงนามในสัญญา		จัดทำแผน	แต่งตั้ง คกก. จัดทำ TOR	ร่างประกาศ/ เผยแพร่ ประกาศ	ประกาศ ผู้ชนะ	รองลงนาม	ลงนามใน สัญญา
เขต 8	146	18	11	14	31	72	14	3	4	1	1	2	3
อุดรธานี	19		1	2	12	4	2	1	1				
- สสจ.อุดรธานี	17		1	2	11	3	2	1	1				
- รพ.อุดรธานี	1				1								
- รพ.กุมภวาปี	1					1							
สกลนคร	47		6	3	12	26	2	1			1		
- สสจ.สกลนคร	22		6		10	6							
- รพ.สกลนคร	19				1	18	2	1			1		
- รพ.สว่างแดนดิน	4			3	1								
- รพ.วานรนิวาส	2					2							
นครพนม	14	1			3	10	1			1			
- สสจ.นครพนม	10					10	1			1			
- รพ.นครพนม	4	1			3								

รายงานติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ก่อนประกาศ :

- ครุภัณฑ์ 29 รายการ ได้แก่ อุดรธานี 1/ สกลนคร 6/ นครพนม 1/ หนองคาย 18/ หนองบัวลำภู 1/ บึงกาฬ 2
- สิ่งก่อสร้าง 8 รายการ ได้แก่ อุดรธานี 2/ สกลนคร 1/ นครพนม 1/ หนองคาย 1/ หนองบัวลำภู 2/ บึงกาฬ 1

หน่วยงาน	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์						ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง สิ่งก่อสร้าง						
	จำนวน (หน่วย)	ก่อนประกาศ		ประกาศ			จำนวน (หน่วย)	ก่อนประกาศ			ประกาศ		
		แต่งตั้ง คกก. จัดทำ TOR	ร่างประกาศ/ เผยแพร่ ประกาศ	ประกาศ ผู้ชนะ	รอลงนาม	ลงนามใน สัญญา		จัดทำแผน	แต่งตั้ง คกก. จัดทำ TOR	ร่างประกาศ/ เผยแพร่ ประกาศ	ประกาศ ผู้ชนะ	รอลงนาม	ลงนามใน สัญญา
เขต 8	146	18	11	14	31	72	14	3	4	1	1	2	3
เลย	12			1	3	8	4					2	2
- สสจ.เลย	8					8	4					2	2
- รพ.เลย	4			1	3								
หนองคาย	33	15	3	2		13	2		1				1
- สสจ.หนองคาย	12					12	2		1				1
- รพ.หนองคาย	1					1							
- รพร.ท่าบ่อ	20	15	3	2									
หนองบัวลำภู	11		1	6	1	3	2		2				
- สสจ.หนองบัวลำภู	8			4	1	3	2		2				
- รพ.หนองบัวลำภู	3		1	2									
บึงกาฬ	10	2				8	1	1					
- สสจ.บึงกาฬ	8					8							
- รพ.บึงกาฬ	2	2					1	1					

รายการที่ส่งกลับแก้ไขที่กองแบบ

- อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และบำบัดรักษา 10 ชั้น รพ.สกลนคร เนื่องจากขอตรวจแบบรายการเพิ่มเติมและรอกองแบบยืนยัน
(รพ.สกลนคร ได้ประสานกองแบบแล้ว แจ้งว่าคาดว่าจะได้รับภายใน ธันวาคม 2568)
- อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน วินิจฉัยรักษา 8 ชั้น รพร.บ้านดุง เนื่องจาก จำนวนวันก่อสร้างในงวดงาน-งวดเงิน ไม่ตรงกัน
(สสจ.อุดรธานี ประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 ซึ่งพบข้อผิดพลาดในเอกสารรายละเอียดประกอบแบบ กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข จึงขอตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง และได้นัดประชุม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 68 ซึ่งคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากกองแบบแผน แจ้งว่าขอตรวจสอบแบบและ BOQ ว่าสอดคล้องกันหรือไม่ คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้ประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 26 ธันวาคม 2568)

BACK UP

รายงานติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (สิ่งก่อสร้าง)

ปีผูกพัน	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	จัดสรรปี 1	ชื่อสถานที่	จังหวัด	รายละเอียดขั้นตอน	ราคากลาง	สรุปขั้นตอน	รายละเอียดการล่าช้า
2	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น	38,594,600.00	1	5,789,200.00	โรงพยาบาลทุ่งฝน	อุดรธานี	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)/คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/คณะกรรมการจัดทำราคากลาง		ก่อนประกาศ	- รอรายชื่อ จนท.จากส่วนกลางที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
3	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน วินิจฉัยรักษา เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น	629,136,800.00	1	94,370,600.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง	อุดรธานี	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง		ก่อนประกาศ	- อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้ง คกก. จัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR
4	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น	662,742,800.00	1	99,411,500.00	โรงพยาบาลสกลนคร	สกลนคร	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง		ก่อนประกาศ	- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง - คาดว่าจะประกาศภายใน ก.พ.69
1	ปรับปรุงห้องสวนหัวใจและหลอดเลือดเพื่อการผ่าตัด (Hybrid Operating Theatre)	18,409,200.00	1	18,409,200.00	โรงพยาบาลสกลนคร	สกลนคร	เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ 1) กรณีวงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่หรือไม่ก็ได้ 2) กรณีวงเงินเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ (หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว680 ลว. 8 ต.ค. 2568)	18,252,282.00	ก่อนประกาศ	- ระหว่างพิจารณาผลประกวดราคา - มีผู้ยื่นเสนอราคา 2 ราย - คาดว่าจะประกาศผลภายใน ธ.ค.68

รายงานติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (สิ่งก่อสร้าง)

ปีผูกพัน	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	จัดสรรปี 1	ชื่อสถานที่	จังหวัด	รายละเอียดขั้นตอน	ราคากลาง	สรุปขั้นตอน	รายละเอียดการล่าช้า
1	อาคารผู้ป่วยพิเศษ เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น	13,208,000.00	1	13,208,000.00	โรงพยาบาลนาหว้า	นครพนม	รายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและร่าง เอกสารประกวดราคา และจัดทำประกาศและ เอกสารประกวดราคา		ก่อนประกาศ	- มีการเปลี่ยนแปลงผู้ลงนาม จึงต้องรอคำสั่ง
1	อาคารผู้ป่วยพิเศษ เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น	13,208,000.00	1	13,208,000.00	โรงพยาบาลนาหว้า	เลย	เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	12,676,700.00	ลงนามสัญญา	-
2	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น	30,610,800.00	1	4,591,700.00	โรงพยาบาลผาขาว	เลย	อยู่ระหว่างรอสำนักงบประมาณราคากลาง ถ้าผ่านแล้ว ถึงจะประกาศผู้ชนะได้ และรอลงนาม ในสัญญาต่อไป	32,523,300.00	รอลงนาม	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น	30,610,800.00	1	4,591,700.00	โรงพยาบาลภูหลวง	เลย	อยู่ระหว่างรอสำนักงบประมาณราคากลาง ถ้าผ่านแล้ว ถึงจะประกาศผู้ชนะได้ และรอลงนาม ในสัญญาต่อไป	32,523,300.00	รอลงนาม	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
1	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับ ต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น	1,658,000.00	1	1,658,000.00	โรงพยาบาลหนอง หิน	เลย	เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	1,506,500.00	ลงนามสัญญา	-

รายงานติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (สิ่งก่อสร้าง)

ปีผูกพัน	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	จัดสรรปี 1	ชื่อสถานที่	จังหวัด	รายละเอียดขั้นตอน	ราคากลาง	สรุปขั้นตอน	สาเหตุการล่าช้า
1	ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร/วัน	12,900,500.00	1	12,900,500.00	โรงพยาบาลโพธิ์พิสัย	หนองคาย	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)/คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/คณะกรรมการจัดทำราคากลาง	12,900,500.00	ก่อนประกาศ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
1	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น	3,058,400.00	1	3,058,400.00	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย	หนองคาย	ลงนามในสัญญาตามแบบที่ คณะกรรมการนโยบายกำหนด ภายหลังพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	3,058,400.00	ลงนามสัญญา	-
3	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น	110,941,000.00	1	16,641,200.00	โรงพยาบาลศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)/คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/คณะกรรมการจัดทำราคากลาง		ก่อนประกาศ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
1	อาคารจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น	9,626,600.00	1	9,626,600.00	โรงพยาบาลสุวรณคูหา	หนองบัวลำภู	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)/คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/คณะกรรมการจัดทำราคากลาง		ก่อนประกาศ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	ท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร /วัน	37,732,000.00	1	5,659,800.00	โรงพยาบาลบึงกาฬ	บึงกาฬ	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง		ก่อนประกาศ	- ใช้แบบเอกชน รอผล การรับรองแบบจากโยธา จังหวัด




**การบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์
ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เขตสุขภาพที่ 8**

24 ธันวาคม 2568




การบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เขตสุขภาพที่ 8 (ไม่รวม sw.สต.ถ่ายโอน)

ร้อยละ เงินจัดสรร ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ในสังกัด สป.สร.

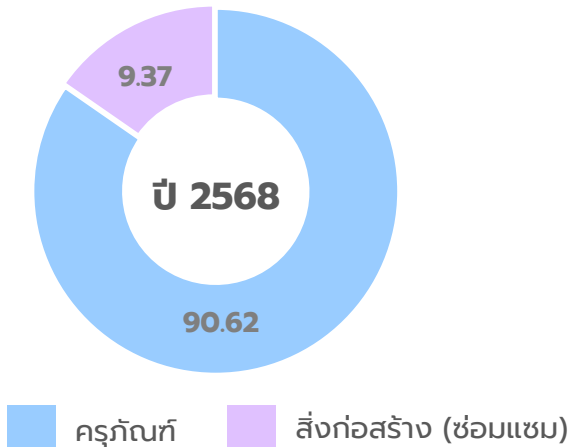


ภาพรวมการจัดสรร ปี 2568 วงเงินทั้งสิ้น 488,417,533.28 บาท

รายการ	70%	20%	10%
จัดสรร	333,214,557.62 (1,565 รายการ)	102,996,300.15 (310 รายการ)	52,206,675.51 (47 รายการ)
เบิกจ่าย	271,317,893.62 (1,509 รายการ)	91,587,396.37 (295 รายการ)	48,553,675.51 (44 รายการ)
คงเหลือ	61,896,664.00 (56 รายการ)	11,408,903.78 (15 รายการ)	3,653,000.00 (3 รายการ)

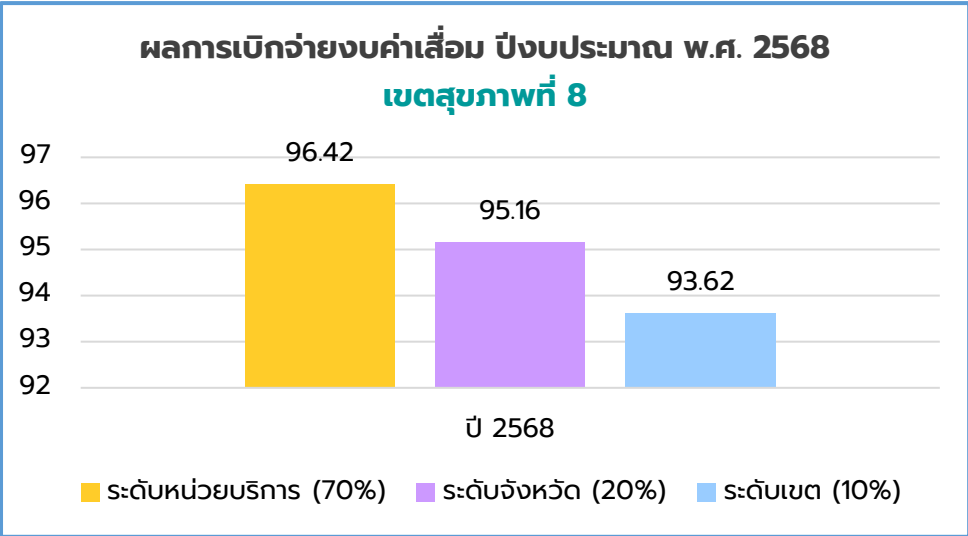

วงเงินและร้อยละการเบิกจ่าย (งบค่าเสื่อม) ในสังกัด สป.สร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายจังหวัด

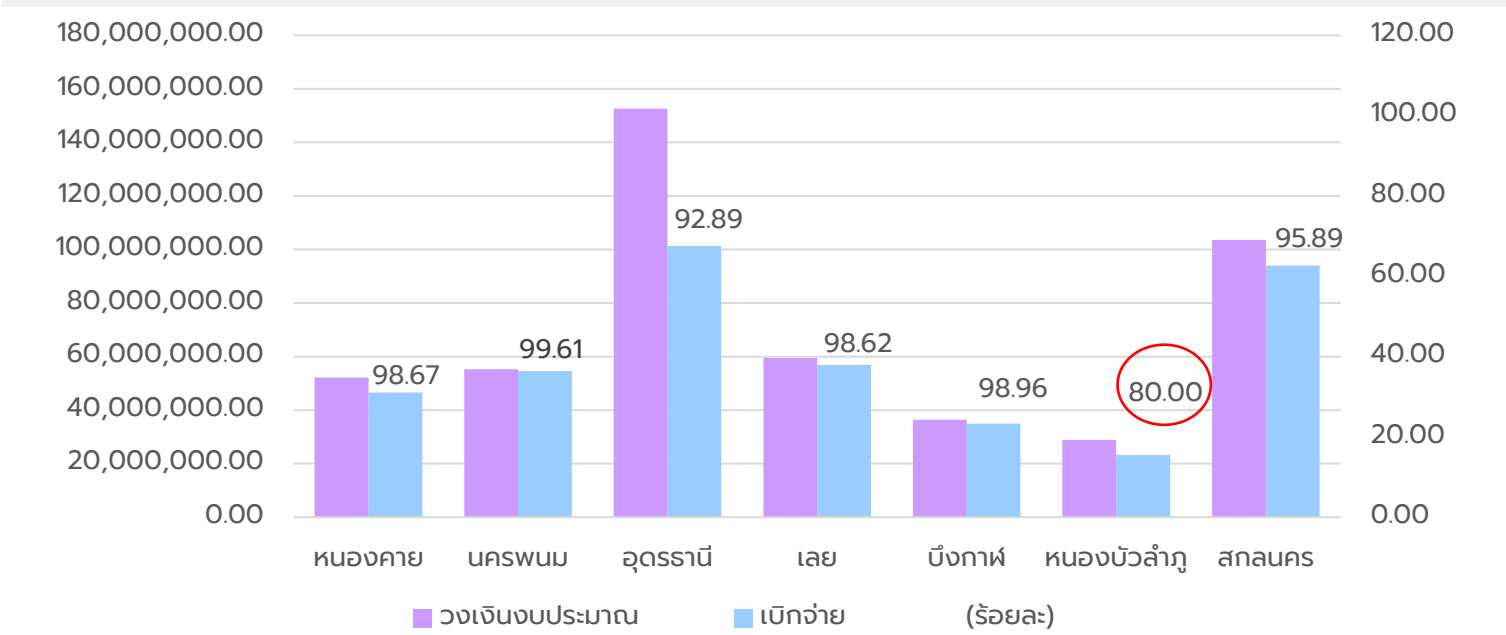



สรุปสถานการณ์ดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปีงบประมาณ 2568 ประเภทงบในสังกัด สป.สร.
เขตสุขภาพที่ 8 (ไม่รวม sw.สต.ถ่ายโอน)

ลำดับ	จังหวัด	วงเงิน งบประมาณ	งบประมาณตาม แผนทั้งหมด	รายการ	จัดทำแผนการ จัดซื้อ/จ้างแล้ว		ขออนุมัติจัดซื้อ/ จ้างแล้ว		ทำสัญญา เรียบร้อยแล้ว		ตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว		เบิกจ่ายเงินแล้ว					
					รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	งบตามแผน	งบที่ใช้ไป	เงินเหลือจ่าย	% เงิน เหลือจ่าย
1	หนองคาย	52,199,237.56	52,199,237.56	301	0	0.00	0	0.00	2	0.66	2	0.66	297	98.67	46,530,394.23	46,216,097.58	314,296.65	0.68
2	นครพนม	55,336,898.82	55,336,898.82	259	0	0.00	0	0.00	1	0.39	0	0.00	258	99.61	54,549,576.93	53,753,582.36	795,994.57	1.46
3	อุดรธานี	152,570,263.90	152,570,263.90	605	0	0.00	20	3.31	15	2.48	8	1.32	562	92.89	101,305,830.18	100,691,051.32	614,778.86	0.61
4	เลย	59,477,081.47	59,477,081.47	290	0	0.00	0	0.00	3	1.03	1	0.34	286	98.62	56,875,066.89	56,702,325.21	172,741.68	0.30
5	บึงกาฬ	36,395,294.66	36,395,294.66	193	0	0.00	0	0.00	2	1.04	0	0.00	191	98.96	34,987,032.09	34,499,417.07	487,615.02	1.39
6	หนองบัวลำภู	28,887,882.39	28,887,882.39	55	1	1.82	1	1.82	5	9.09	4	7.27	44	80.00	23,205,949.51	23,025,053.51	180,896.00	0.78
7	สกลนคร	103,550,874.48	103,550,874.48	219	0	0.00	3	1.37	4	1.83	2	0.91	210	95.89	94,005,115.67	93,317,382.67	687,733.00	0.73
รวม		488,417,533.28	488,417,533.28	1,922	1	0.05	24	1.25	32	1.66	17	0.88	1,848	96.15	411,458,965.50	408,204,909.72	3,254,055.78	0.79

จังหวัดที่ “ยังไม่ลงนามสัญญา” : รวมทั้งหมด 25 รายการ

- หนองบัวลำภู จำนวน 2 รายการ
- สกลนคร จำนวน 3 รายการ
- อุดรธานี จำนวน 20 รายการ

* ขอเร่งรัดให้ดำเนินการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จก่อน ธันวาคม 2568 *

BACK UP



สรุปสถานการณ์ดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปีงบประมาณ 2568 ประเภทงบในสังกัด สป.สร.
เขตสุขภาพที่ 8 (ไม่รวม sw.สต.ถ่ายโอน) “ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา”

จังหวัดหนองบัวลำภู 2 รายการ

จังหวัด	หน่วยบริการ แม่ข่าย	หน่วยบริการ ลูกข่าย	ประเภทแผน	ประเภท	รายการ	จำนวน	รวมเงิน	หมายเหตุ การดำเนินการ
หนองบัวลำภู	sw.หนองบัวลำภู	sw.หนองบัวลำภู	หน่วยบริการ	ครุภัณฑ์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1	970,900.00	- ยกเลิก bidding ใหม่ เนื่องจากคณะกรรมการ กำหนด Specs ขอบทวน Specs ใหม่
หนองบัวลำภู	sw.โนนสัง	sw.โนนสัง	หน่วยบริการ	ครุภัณฑ์	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณ ชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง	4	600,000.00	- ทำประกาศประกวดราคาไปแล้ว 1 ครั้ง แต่ไม่มีผู้ เสนอราคา

จังหวัดสกลนคร 3 รายการ

จังหวัด	หน่วยบริการ แม่ข่าย	หน่วยบริการ ลูกข่าย	ประเภทแผน	ประเภท	รายการ	จำนวน	รวมเงิน	หมายเหตุ การดำเนินการ
สกลนคร	sw.กุสุมาลย์	sw.กุสุมาลย์	จังหวัด	ครุภัณฑ์	เครื่องอบผ้าขนาด 200 ปอนด์	1	430,000.00	- อุดหนุนผู้ชนะ อยู่ระหว่าง คกก.วินิจัย กรมบัญชีกลาง พิจารณา
สกลนคร	sw.พระอาจารย์ฝั้น อาจาริ	sw.พระอาจารย์ ฝั้นอาจาริ	จังหวัด	ครุภัณฑ์	เครื่องบรรจุผงยาบลิสเตอร์แคปซูล แบบ 4 แผง	1	1,394,258.81	- อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
สกลนคร	sw.พระอาจารย์ฝั้น อาจาริ	sw.พระอาจารย์ ฝั้นอาจาริ	จังหวัด	ครุภัณฑ์	เครื่องอบผ้า ขนาด 200 ปอนด์	1	430,000.00	- อุดหนุนผู้ชนะ อยู่ระหว่าง คกก.วินิจัย กรมบัญชีกลาง พิจารณา



สรุปสถานการณ์ดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปีงบประมาณ 2568 ประเภทงบในสังกัด สป.สร.
เขตสุขภาพที่ 8 (ไม่รวม sw.สต.ถ่ายโอน) “ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา”

จังหวัดอุดรธานี 20 รายการ

จังหวัด	หน่วยบริการ แม่ข่าย	หน่วยบริการ ลูกข่าย	ประเภทแผน	ประเภท	รายการ	จำนวน	รวมเงิน	หมายเหตุ การดำเนินการ
อุดรธานี	sw.อุดรธานี	sw.สต.บ้านนาข่า	หน่วยบริการ	ครุภัณฑ์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิลแคว็บ	1	935,000.00 -	ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อุดรธานี	sw.อุดรธานี	sw.อุดรธานี	หน่วยบริการ	ครุภัณฑ์	ตู้แช่ยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	2	140,000.00 -	ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อุดรธานี	sw.อุดรธานี	sw.อุดรธานี	หน่วยบริการ	ครุภัณฑ์	กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบ พร้อม ระบบเก็บภาพดิจิทัล	1	850,000.00 -	ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อุดรธานี	sw.อุดรธานี	sw.อุดรธานี	หน่วยบริการ	ครุภัณฑ์	เครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและแรงดัน ชนิดทำงานด้วยระบบ Turbine	10	6,500,000.00 -	ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อุดรธานี	sw.อุดรธานี	sw.อุดรธานี	หน่วยบริการ	ครุภัณฑ์	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 570 ลิตรชนิด 2 ประตู	1	4,798,192.75 -	ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อุดรธานี	sw.อุดรธานี	sw.อุดรธานี	หน่วยบริการ	ครุภัณฑ์	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณ ชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง	7	1,050,000.00 -	ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อุดรธานี	sw.อุดรธานี	sw.อุดรธานี	หน่วยบริการ	ครุภัณฑ์	เครื่องช่วยหายใจสำหรับการรอกแรกเกิดชนิดความถี่ สูงแบบขับเคลื่อน	1	2,000,000.00 -	ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อุดรธานี	sw.อุดรธานี	sw.อุดรธานี	หน่วยบริการ	ครุภัณฑ์	ชุดสว่านไฟฟ้า ฝ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก	1	1,500,000.00 -	ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์



สรุปสถานการณ์ดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปีงบประมาณ 2568 ประเภทบในสังกัด สป.สร.
เขตสุขภาพที่ 8 (ไม่รวม sw.สต.ถ่ายโอน) “ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา”

จังหวัดอุดรธานี								
จังหวัด	หน่วยบริการ แม่ข่าย	หน่วยบริการ ลูกข่าย	ประเภทแผน	ประเภท	รายการ	จำนวน	รวมเงิน	หมายเหตุ การดำเนินการ
อุดรธานี	sw.อุดรธานี	sw.อุดรธานี	หน่วยบริการ	สิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ	1	1,835,046.00	- ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อุดรธานี	sw.อุดรธานี	sw.อุดรธานี	หน่วยบริการ	ครุภัณฑ์	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดใหญ่	2	600,000.00	- ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อุดรธานี	sw.อุดรธานี	sw.อุดรธานี	หน่วยบริการ	ครุภัณฑ์	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง	2	1,600,000.00	- ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อุดรธานี	sw.อุดรธานี	sw.อุดรธานี	หน่วยบริการ	ครุภัณฑ์	เตียงผู้ป่วยชนิดสามเอนกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ	94	5,170,000.00	- ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อุดรธานี	sw.อุดรธานี	sw.อุดรธานี	หน่วยบริการ	ครุภัณฑ์	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับใช้แบบ non invasive และ invasive พร้อมแบตเตอรี่สำรอง	4	1,800,000.00	- ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อุดรธานี	sw.อุดรธานี	sw.อุดรธานี	หน่วยบริการ	ครุภัณฑ์	ตู้แช่แข็ง	1	100,000.00	- ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อุดรธานี	sw.อุดรธานี	sw.อุดรธานี	หน่วยบริการ	ครุภัณฑ์	ตู้อบเด็กพร้อมปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นการรกแรกเกิดชนิดความร้อน	2	2,600,000.00	- ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อุดรธานี	sw.อุดรธานี	sw.อุดรธานี	หน่วยบริการ	ครุภัณฑ์	เครื่องช่วยหายใจความดันบวก 2 ระดับ	4	600,000.00	- ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์



สรุปสถานการณ์ดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปีงบประมาณ 2568 ประเภทงบในสังกัด สป.สร.
เขตสุขภาพที่ 8 (ไม่รวม sw.สต.ถ่ายโอน) “ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา”

จังหวัดอุดรธานี								
จังหวัด	หน่วยบริการ แม่ข่าย	หน่วยบริการ ลูกข่าย	ประเภทแผน	ประเภท	รายการ	จำนวน	รวมเงิน	หมายเหตุ การดำเนินการ
อุดรธานี	sw.อุดรธานี	sw.อุดรธานี	หน่วยบริการ	ครุภัณฑ์	ชุดเครื่องฆ่าตัดกระจกตา	1	800,000.00	- ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อุดรธานี	sw.อุดรธานี	sw.อุดรธานี	หน่วยบริการ	ครุภัณฑ์	เครื่องจำกัดเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า	1	1,600,000.00	- ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อุดรธานี	sw.อุดรธานี	sw.อุดรธานี	หน่วยบริการ	ครุภัณฑ์	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่	3	3,600,000.00	- ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อุดรธานี	sw.ศรีธาตุ	sw.สต.บ้านนา เรียง	หน่วยบริการ	ครุภัณฑ์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมี ช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)	1	736,000.00	- ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


แผนคำขอโครงการสลากการกุศล

โดย นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
ประธาน CSEO เขตสุขภาพที่ 8

สรุปวงเงินแผนคำขอโครงการสลาภการกุศล เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2569



■ งบประมาณที่ขอสนับสนุน (บาท)



จังหวัด	งบประมาณที่ขอสนับสนุน (บาท)
อุดรธานี	992,060,020.00
สกลนคร	1,782,068,840.00
หนองคาย	60,985,300.00
บึงกาฬ	109,628,295.00
เขต 8	2,944,742,455.00

รายการคำขอโครงการสละการกุศล เขตสุขภาพที่ 8



จังหวัด	หน่วยงาน	โครงการ	ประเภท	งบประมาณที่ขอ สนับสนุน (บาท)	ผ่านผู้ว่าฯ
อุดรธานี	โรงพยาบาลอุดรธานี	พัฒนาศักยภาพการบริการ โรงพยาบาลอุดรธานี - ก่อสร้างอาคารศูนย์เชี่ยวชาญด้านมะเร็งครบวงจรและห้องผ่าตัด 10 ชั้น วงเงิน 531,867,700.00 บาท - จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ วงเงิน 452,100,000.00 บาท	ก่อสร้างและครุภัณฑ์	983,967,700.00	ไม่ผ่าน
อุดรธานี	โรงพยาบาลนาูง	ก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง	ก่อสร้าง	5,592,320.00	ไม่ผ่าน
อุดรธานี	โรงพยาบาลนาูง	รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง 1 คัน	ครุภัณฑ์	2,500,000.00	ไม่ผ่าน
หนองคาย	โรงพยาบาลโพนพิสัย	อาคารทันตกรรม 16 ยูนิต (แบบต้านแผ่นดินไหว) และครุภัณฑ์ทันตกรรม	ก่อสร้างและครุภัณฑ์	60,985,300.00	ไม่ผ่าน
บึงกาฬ	โรงพยาบาลบึงกาฬ	จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อพัฒนาศักยภาพบริการทุกระดับ จำนวน 30 รายการ	ครุภัณฑ์	76,290,000.00	ผ่าน
บึงกาฬ	โรงพยาบาลบึงกาฬ	ศูนย์บริการชั้นเลิศ ด้านระบบประสาทและสมอง - ปรับปรุงห้องผ่าตัดความดันบวก (Positive Pressure) จำนวน 5 ห้อง	ก่อสร้าง	19,377,270.00	ผ่าน
บึงกาฬ	โรงพยาบาลบึงกาฬ	ปรับปรุงห้องผ่าตัดความดันบวก (Positive Pressure) จำนวน 2 ห้อง (รายการ68 ที่ได้รับเลือก)	ก่อสร้าง	8,077,355.00	68-ผ่าน 69-ผ่าน
บึงกาฬ	สสจ.บึงกาฬ	จัดตั้งคลินิกบริการกายภาพบำบัด	ก่อสร้างและครุภัณฑ์	5,883,670.00	ผ่าน

รายการคำขอโครงการสละการกุศล เขตสุขภาพที่ 8



จังหวัด	หน่วยงาน	โครงการ	ประเภท	งบประมาณที่ขอ สนับสนุน (บาท)	ผ่านผู้ว่าฯ
สกลนคร	โรงพยาบาลสกลนคร	อาคารพักคนไข้ 10 ชั้น (อาคารโรงพยาบาลสงฆ์)	สิ่งก่อสร้าง	191,706,600.00	ผ่าน
สกลนคร	โรงพยาบาลสกลนคร	อาคารพักคนไข้ 10 ชั้น (อาคารผู้สูงอายุ)	สิ่งก่อสร้าง	535,121,700.00	ผ่าน
สกลนคร	โรงพยาบาลพระอาจารย์วัน อุตฺตโม	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น (รายการ68 ที่ได้รับเลือก)	สิ่งก่อสร้าง	73,329,200.00	68-ไม่ผ่าน 69-ไม่ผ่าน
สกลนคร	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน วินิจฉัยรักษา 8 ชั้น	สิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์	769,355,200.00	ไม่ผ่าน
สกลนคร	โรงพยาบาลกุสุมาลย์	อาคารหน่วยฟอกไตเทียม ค.ส.ล.1ชั้น	สิ่งก่อสร้าง	4,933,000.00	ไม่ผ่าน
สกลนคร	โรงพยาบาลพังโคน	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 6 ชั้น 72 ยูนิต	สิ่งก่อสร้าง	102,065,000.00	ไม่ผ่าน
สกลนคร	โรงพยาบาลเจริญศิลป์	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	สิ่งก่อสร้าง	73,329,240.00	ไม่ผ่าน
สกลนคร	โรงพยาบาลอากาศอำนวย	อาคารทันตกรรม 8 ยูนิต	สิ่งก่อสร้าง	25,333,200.00	ไม่ผ่าน
สกลนคร	โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่ง ภูริทัตโต	อาคารห้องน้ำ-ส้วม 8 ห้อง (พร้อมห้องน้ำ-ส้วม สำหรับคนพิการและ คนชรา)	สิ่งก่อสร้าง	1,995,700.00	ไม่ผ่าน
สกลนคร	โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่ง ภูริทัตโต	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์พร้อมติดตั้งและอาคาร เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	ครุภัณฑ์	4,900,000.00	ไม่ผ่าน 30



THANK YOU
