



การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



นพ.กรกฤษ ลิ้มสมมุติ
ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข
23 มกราคม 2567

กรอบการนำเสนอ

1

การบริหารงบประมาณปี 2566 ที่กันเงินเหลือมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2567

2

ภาพรวมการจัดสรรย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2565 – 2567)

3

ภาพรวม **ร่าง** พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2567

4

Timeline การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

5

สภาพปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา

6

แนวทางการเตรียมการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

7

การดำเนินการของ กบรส.


1. การบริหารงบลงทุนปี 2566 ที่กันเงินหลัอมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2567

งบลงทุนที่กันเงินหลัอมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2566 ณ 1 ต.ค. 66 วงเงิน 5,598,908,892.69 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,262,604,737.70 บาท (ร้อยละ 22.55)

วงเงินคงเหลือที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 4,336,033,095.76 บาท

IVต	ภาพรวม				ครุภัณฑ์		ก่อสร้างปีเดียว		ก่อสร้างผูกพัน	
	จำนวน (รายการ) 1 ร.ค. 66	วงเงินคงเหลือ (ลบ.) 1 ร.ค. 66	จำนวน (รายการ) 1 ม.ค. 67	วงเงินคงเหลือ (ลบ.) 1 ม.ค. 67	จำนวน (รายการ)	วงเงินคงเหลือ (ลบ.)	จำนวน (รายการ)	วงเงินคงเหลือ (ลบ.)	จำนวน (รายการ)	วงเงินคงเหลือ (ลบ.)
ผลรวม	346	4,843.27	281	4,336.03	23	230.77	145	487.26	113	3,618.01
1	25	434.35	20	412.10	5	153.32	6	30.28	9	228.50
2	20	447.20	20	405.61			9	24.18	11	381.43
3	14	211.23	14	198.34			7	16.92	7	181.42
4	22	432.04	19	384.38			12	47.44	7	336.93
5	16	230.19	13	195.89			4	4.35	9	191.55
6	24	266.10	22	258.25			13	25.42	9	232.83
7	19	290.86	15	270.94	1	7.20	10	29.04	4	234.69
8	34	517.68	28	430.42			22	44.67	6	385.75
9	28	729.07	23	643.66			7	26.23	16	617.43
10	27	172.41	15	146.94	2	7.60	5	19.89	8	119.45
11	45	482.95	38	426.08			25	92.55	13	333.53
12	35	448.29	31	414.10	1	1.82	22	124.47	8	287.81
สพพช.	6	92.57	6	86.68					6	86.68
ส่วนกลาง	31	88.33	17	62.64	14	60.83	3	1.81		



2. ภาพรวมการจัดสรรย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2565 – 2567)

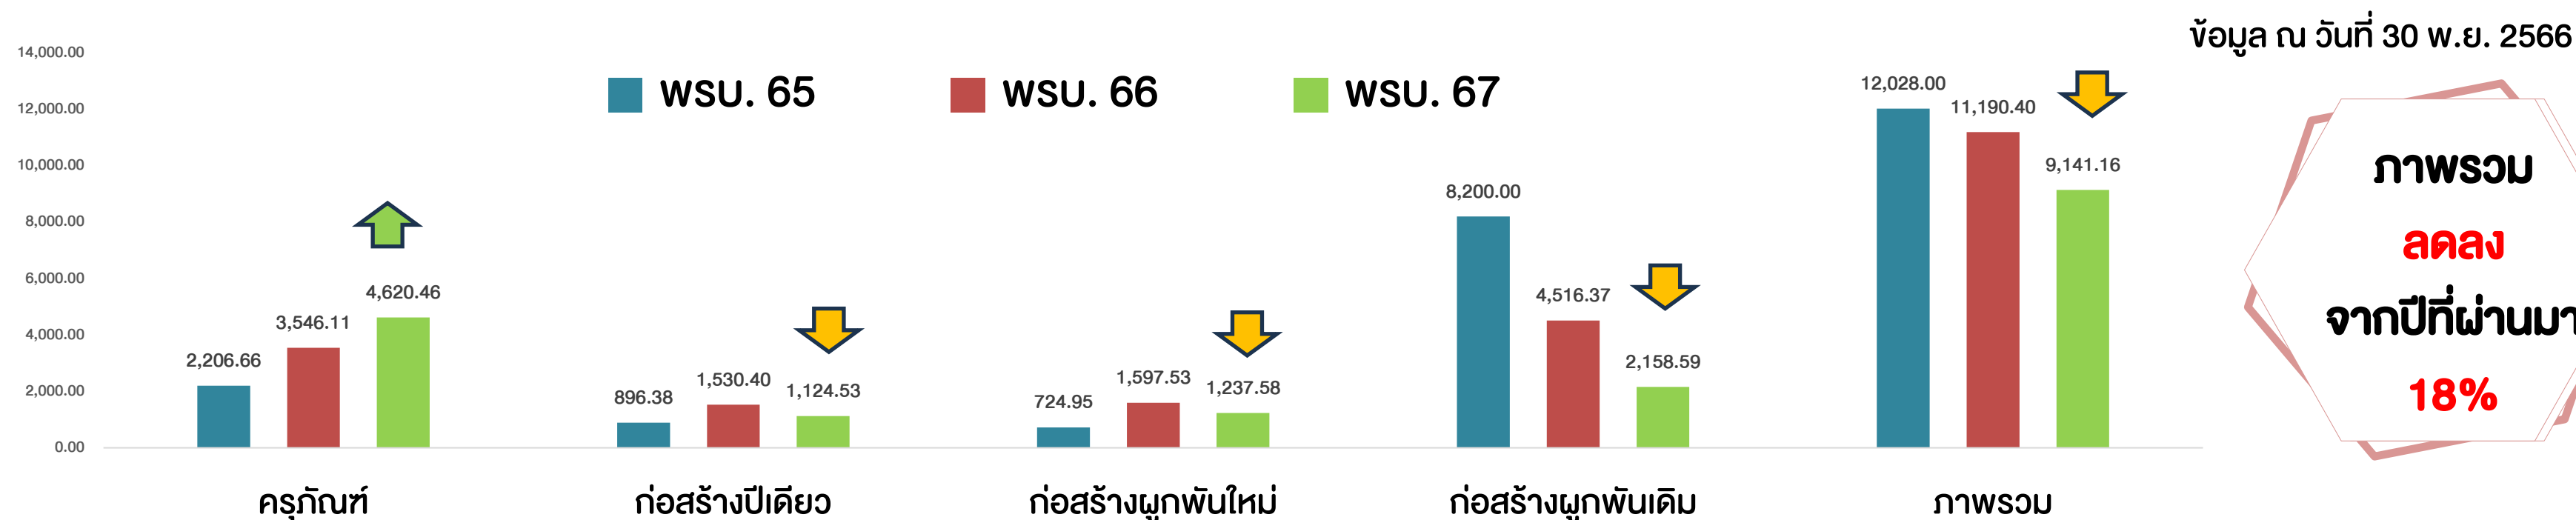

	พ.ร.บ.ปี 65		พ.ร.บ.ปี 66		ร่าง พ.ร.บ. 67		เปรียบเทียบส่วนต่าง ปี 67 กับ 66		
	หน่วย	วงเงิน	หน่วย	วงเงิน	หน่วย	วงเงิน	วงเงิน	เพิ่ม/ลด	ร้อยละ
ภาพรวม	4,722	12,027,999,000	5,797	11,190,402,100	4,103	9,141,164,200	-2,049,323,400	ลด	-18.31
ครุภัณฑ์รายการใหม่	4,257	2,206,661,400	5,057	3,546,105,600	3,463	4,620,464,000	1,074,272,900	เพิ่ม	30.29
สิ่งก่อสร้างรายการใหม่	321	1,621,335,800	659	3,127,930,500	547	2,362,109,800	-765,820,700	ลด	-24.48
สิ่งก่อสร้างปีเดียว	298	896,384,500	597	1,530,396,400	452	1,124,534,200	-405,862,200	ลด	-26.52
สิ่งก่อสร้างผูกพัน	23	724,951,300	62	1,597,534,100	95	1,237,575,600	-359,958,500	ลด	-22.53
รวมรายการใหม่	4,578	3,827,997,200	5,716	6,674,036,100	4,009	6,982,573,800	308,452,200	เพิ่ม	4.62
สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม	144	8,200,001,800	81	4,516,366,000	93	2,158,590,400	-2,357,775,600	ลด	-52.21


3. ภาพรวม **ร่าง** พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จำนวน 4,103 หน่วย
วงเงินรวมทั้งสิ้น 9,141.16 ล้านบาท

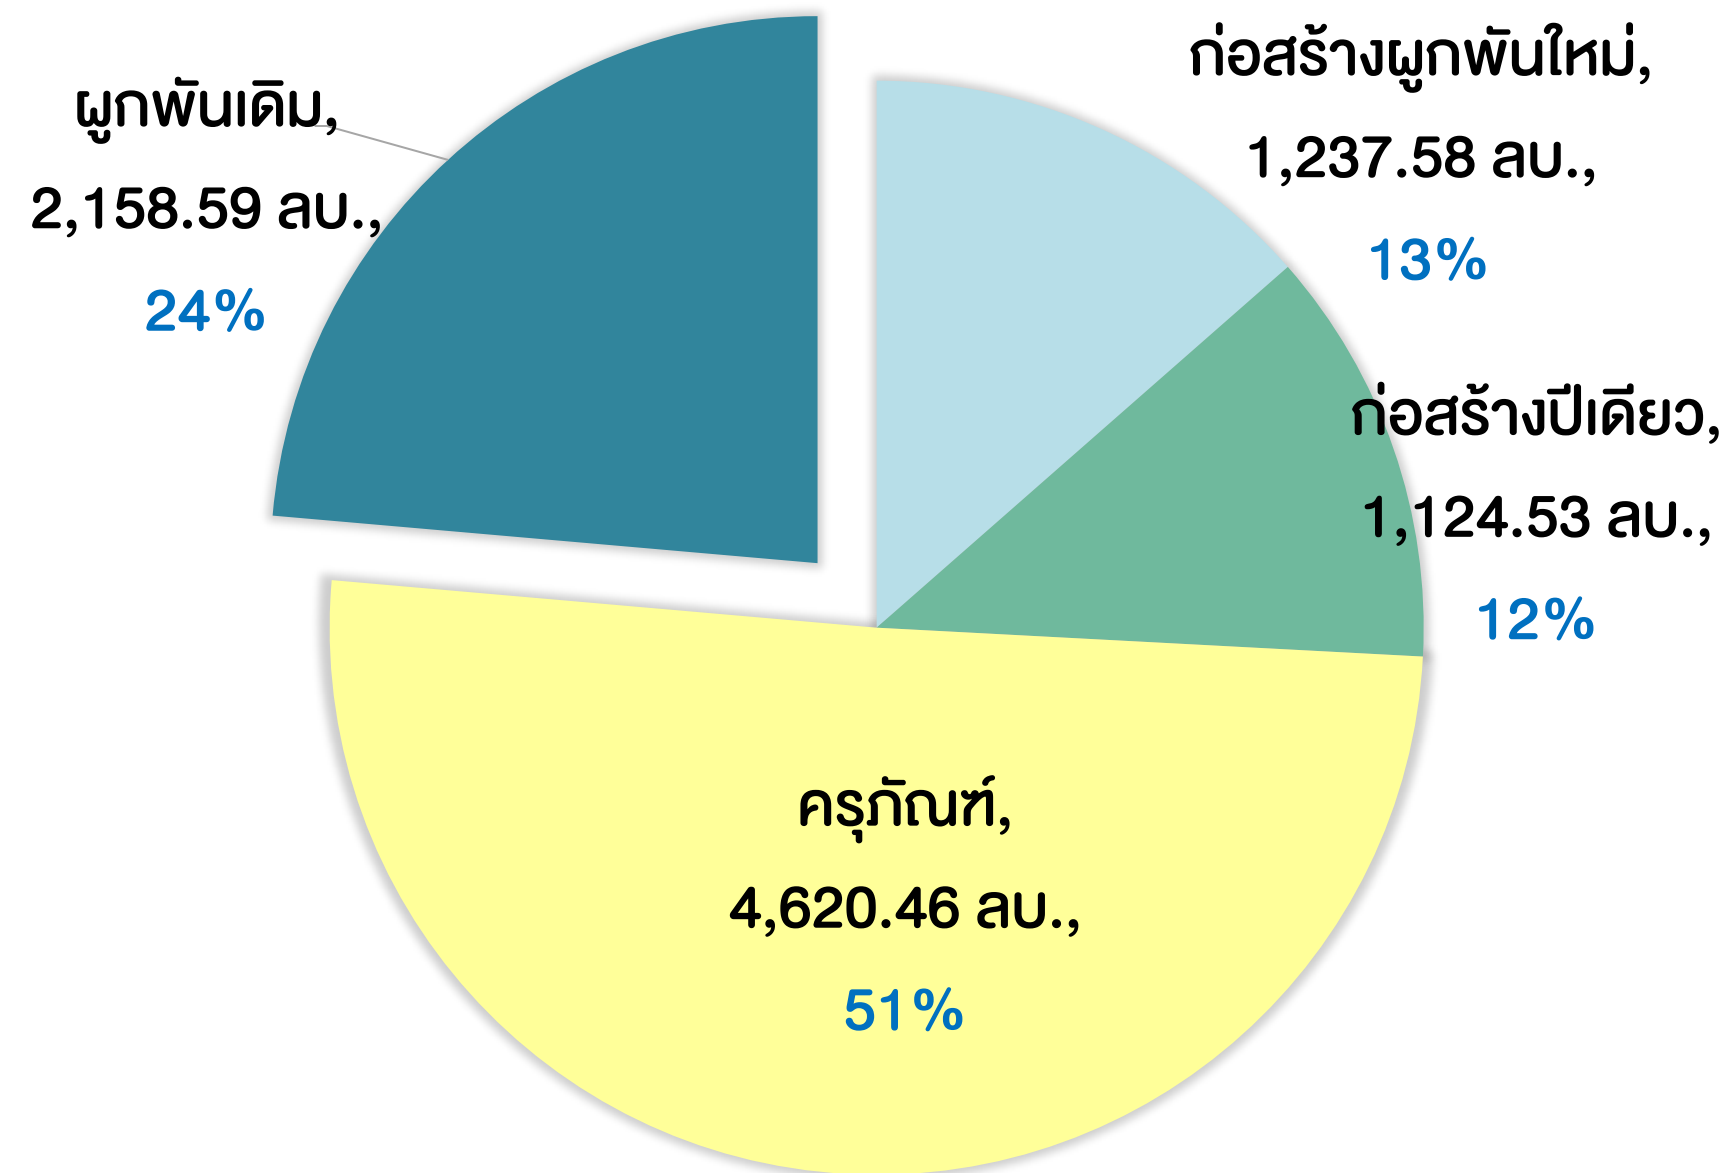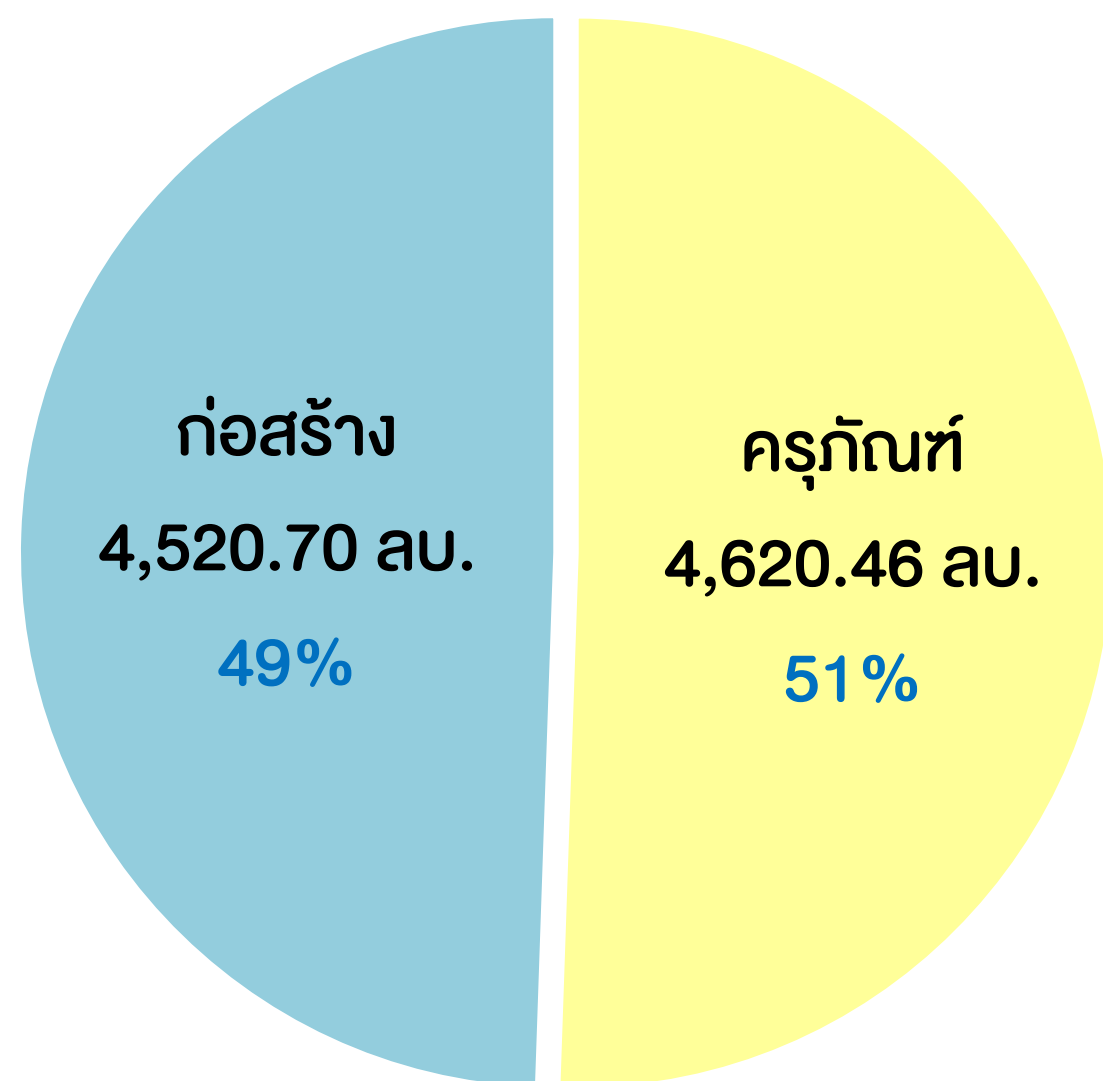

4. Timeline การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567

กบร.ส.

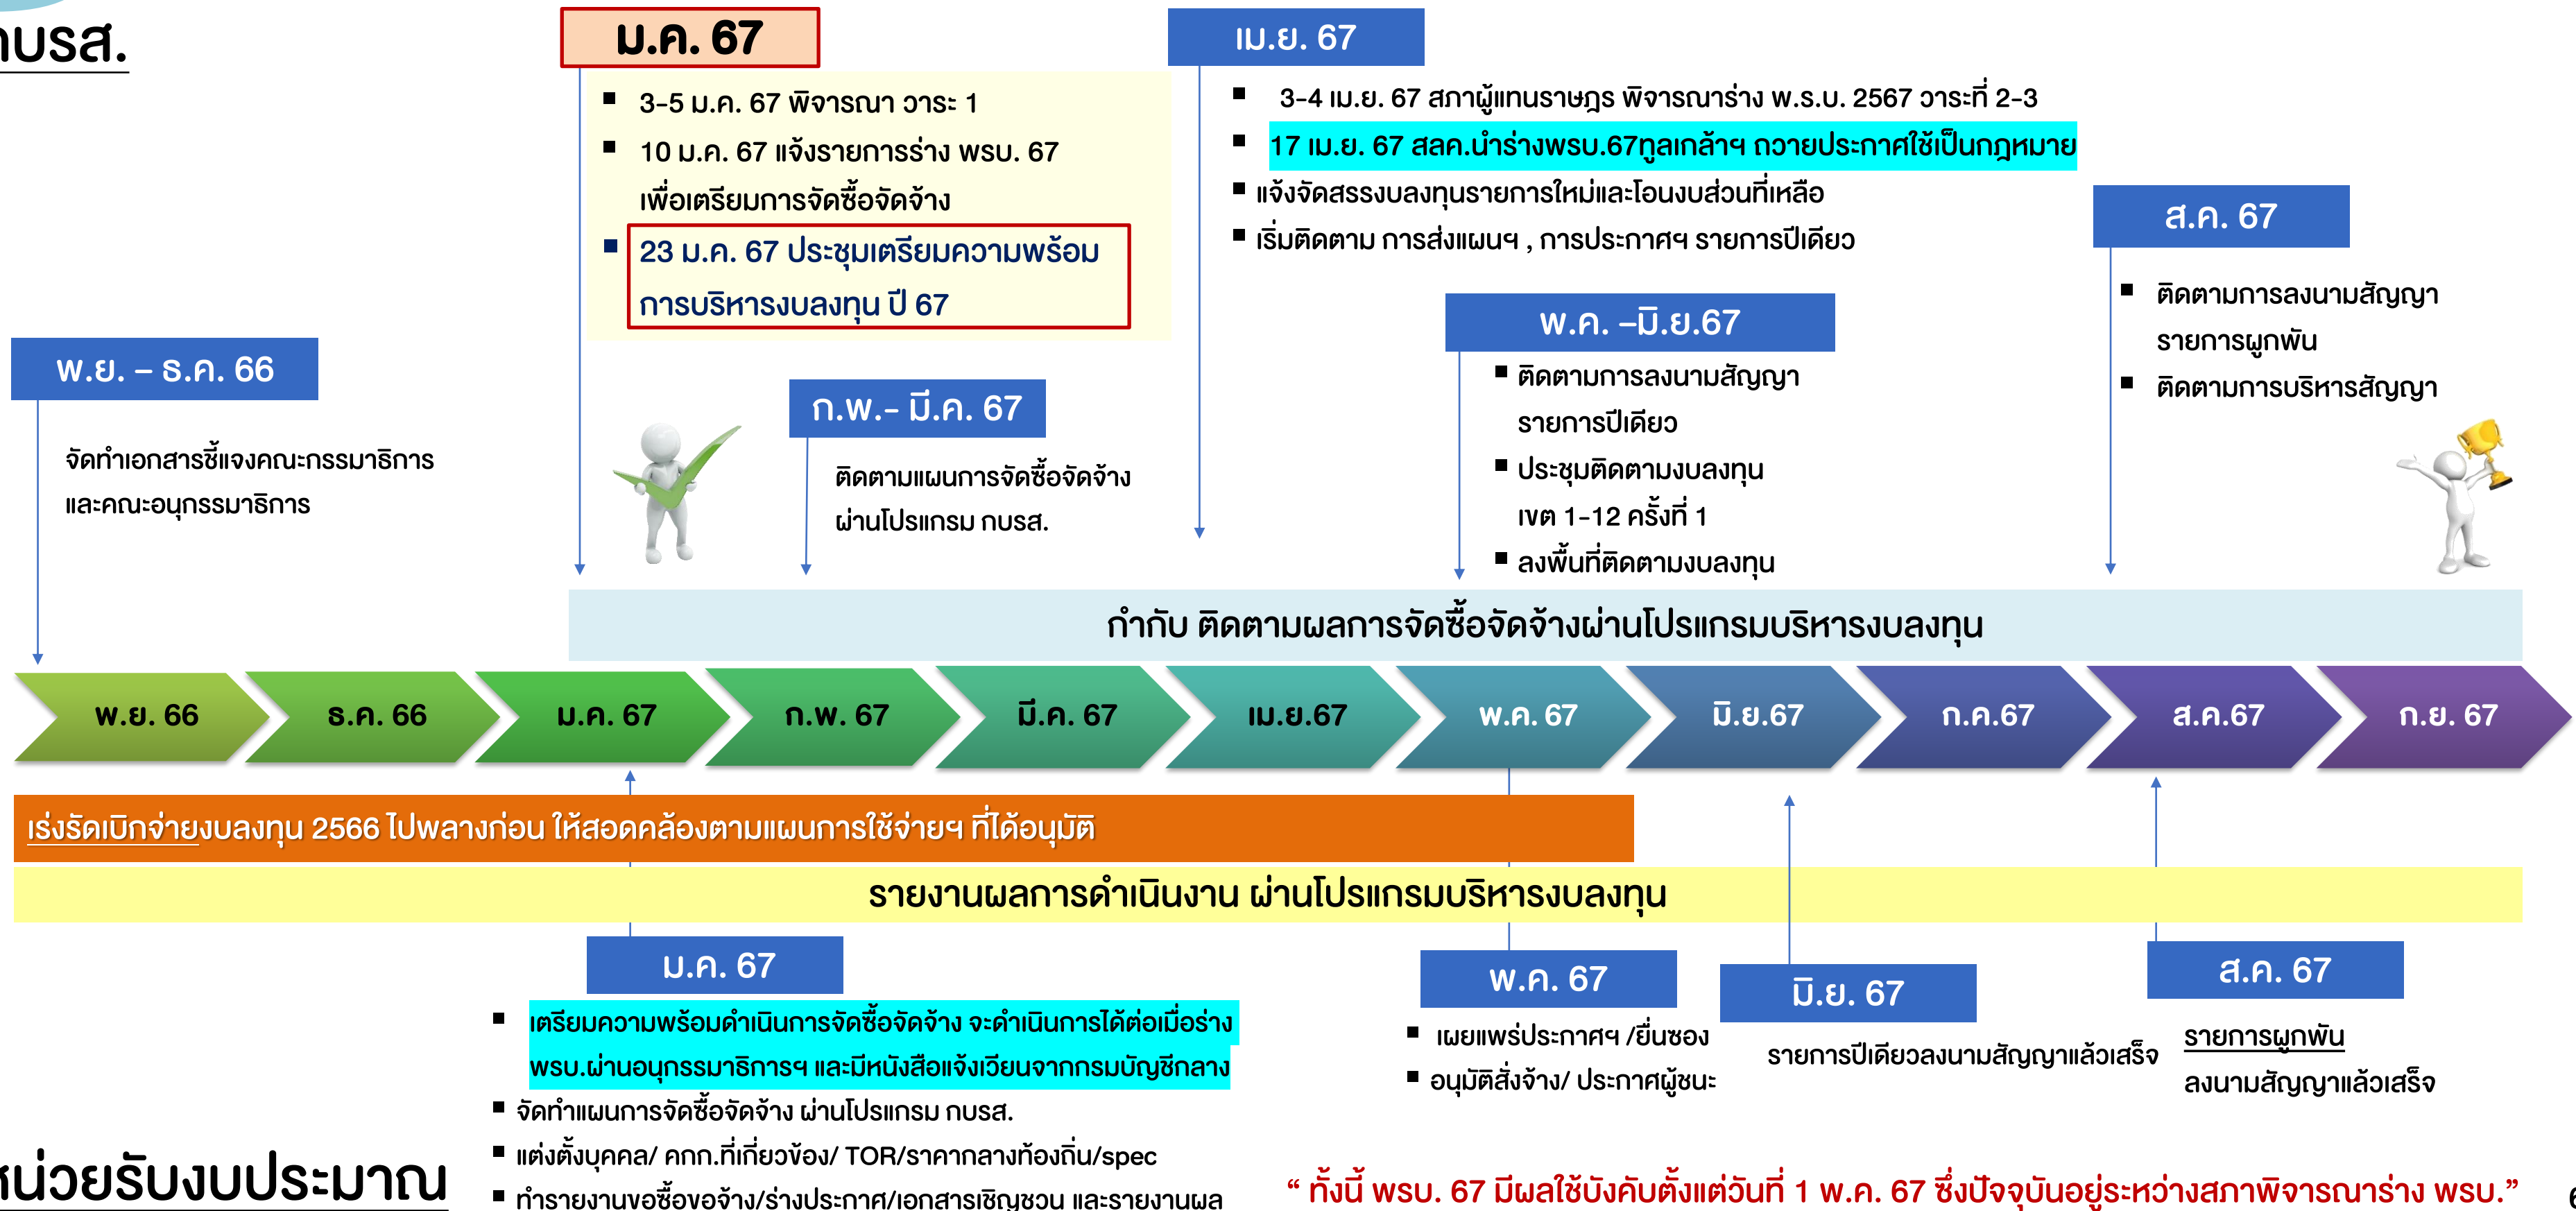

5. สภาพปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา



เสนอคำขอ งบประมาณ

- ไม่เห็นถึง สภาพปัญหา ความต้องการ ความพร้อม แผนการพัฒนาระยะยาว
- Master plan ไม่สอดคล้องการ จัดบริการ
- แบบแผนไม่ตรงตามความต้องการ ของพื้นที่
- ออกแบบไม่ทันในช่วงการเสนอคำขอ
- ไม่มีการบูรณาการการทำงาน ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค



จัดซื้อจัดจ้าง - บริหารสัญญา

- แก้ไขแบบแปลน เนื่องจากแบบแปลน ไม่สอดคล้องกับความต้องการจัดบริการ
- สถานที่ก่อสร้างไม่พร้อม ส่งมอบพื้นที่ ก่อสร้างล่าช้า
- เตรียมแผนและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า
- การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบฯ ส่งผลต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- การปรับปรุงราคามาตรฐาน ราคาวัสดุ ก่อสร้าง ส่งผลให้งบไม่เพียงพอ
- รายงานความก้าวหน้าไม่ต่อเนื่อง



เปิดให้บริการ

- ไม่สามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ทันที เนื่องจากขาดครุภัณฑ์ประกอบ อาคาร หรือครุภัณฑ์สำคัญในการ เปิดบริการ
- ประโยชน์ใช้สอยอาคารไม่สอดคล้อง กับแผนการจัดบริการ
- บุคลากรไม่เพียงพอ
- แผนการจัดบริการไม่สอดคล้อง กับศักยภาพ

6. แนวทางการเตรียมการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



หน่วยรับงบประมาณ
เตรียมการจัดซื้อจัด
จ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560

จัดทำแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง และรายงาน
ผ่าน “โปรแกรม
บริหารงบประมาณ”
เมื่อผ่านการ
พิจารณาจากคณะ
อนุกรรมการฯ
(ประมาณปลายเดือนก.พ.-
ต้นเดือนมี.ค. 67)

ดำเนินการตาม
ระเบียบฯ มาตรการที่
เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงบประมาณ
และการจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างเคร่งครัด

ให้ใช้แบบรูป
รายการสิ่งก่อสร้าง
และสถานที่ก่อสร้าง
ตามที่ได้รับอนุมัติ

รายงานผลการ
ดำเนินงานผ่าน
“โปรแกรมบริหาร
งบประมาณ” **ทันที**
หลังจากเสร็จสิ้นแต่ละ
ขั้นตอน โดย กบรส.
จะติดตาม
ความก้าวหน้าทุกวัน
พฤหัสบดีทุกสัปดาห์

ทั้งนี้ จะดำเนินการได้ต่อเมื่อร่าง พรบ.ผ่านอนุกรรมการฯ และมีหนังสือแจ้งเวียนจากกรมบัญชีกลาง

6. แนวทางการเตรียมการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง ปังบประมาณ พ.ศ. 2567



ศึกษากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ

1

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2

พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

3

พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

4

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561

5

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

6

ระเบียบว่าด้วยการก่องนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

7

มติ ครม./หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

7. การดำเนินการของ กบรส.

1

แจ้งเวียนหนังสือจากกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

2

แจ้งรายการเบื้องต้นเมื่อ ร่าง พรบ. ผ่านการพิจารณาขึ้นอนุกรรมการฯ รายหน่วยงานเสร็จสิ้น
และแจ้งจัดสรรเมื่อ พรบ. มีผลบังคับใช้

3

ประสานกองแบบแผน กรม สบส. เพื่อจัดทำแบบแปลน บัญชีแสดงรายการก่อสร้าง (BOQ)
งวดงาน-งวดเงิน รายการประกอบแบบ และเอกสารส่วนที่เกี่ยวข้อง

4

กำกับ ติดตามการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างผ่านโปรแกรมบริหารงบประมาณ และเสนอผู้บริหาร



ขอบคุณครับ

